Bundesamt für Strassen ASTRA
Filiale Winterthur

N01/46,48 UPlaNS Effretikon - Ohringen
Massnahmenprojekt (MP)
Terminprogramm

Projekt Nr. 080427
Dok. Nr. 080427-MP-TU-46/48-311.00-10.005

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen
1	MASSNAHMENPROJEKT (MP)	600 Tage	01.02.16	18.05.18
2	Erstellung MP	435 Tage	01.02.16	29.09.17
3	Vorprüfung FU	70 Tage	23.10.17	26.01.18
4	Überarbeitung / Fertigstellung MP	40 Tage	29.01.18	23.03.18
5	Genehmigung MP durch FU	1 Tag	18.05.18	18.05.18
6				
7	SUBMISSION	285 Tage	05.03.18	05.04.19
8	Erstellung der Ausschreibungsunterlagen	125 Tage	05.03.18	24.08.18
9	Publikation Submission	1 Tag	28.09.18	28.09.18
10	Offerteingabe	1 Tag	21.12.18	21.12.18
11	Offertvergleich und Vergabeantrag	41 Tage	03.01.19	28.02.19
12	Vergabe der Arbeiten	1 Tag	08.03.19	08.03.19
13	Beschwerdefrist	20 Tage	11.03.19	05.04.19
14				
15	AVOR UN	190 Tage	08.04.19	27.12.19
16				
17	Verkehrsführung	910 Tage	03.06.19	25.11.22
18	Verkehrsphase 0 (PS-Baustellen und Spurabbauten gemäss TESI)	190 Tage	03.06.19	21.02.20
19	Verkehrsumstellung / Einrichten Verkehrsphase 1 (Markierung gespritzt)	15 Tage	03.02.20	21.02.20
20	Verkehrsphase 1, VF 3/3 entlang Aussenrändern FB SG und FB ZH	45 Tage	24.02.20	24.04.20
21	Verkehrsumstellung / Einrichten Verkehrsphase 2 (Markierung gespritzt)	5 Tage	27.04.20	01.05.20
22	Verkehrsphase 2, VF 4/2 FB SG, FB ZH entlang Aussenrand	35 Tage	04.05.20	19.06.20
23	Verkehrsumstellung / Einrichten Verkehrsphase 3 (Markierung geklebt)	5 Tage	22.06.20	26.06.20
24	Verkehrsphase 3, VF 4/2 FB SG, FB ZH entlang Innenrand	55 Tage	29.06.20	11.09.20
25	Verkehrsumstellung / Einrichten Verkehrsphase 4 (Markierung geklebt)	10 Tage	14.09.20	25.09.20
26	Verkehrsphase 4, VF 4/2 FB ZH, FB SG entlang Aussenrand	40 Tage	28.09.20	20.11.20
27	Verkehrsumstellung / "Neutralisation" und Freigabe der Verkehrsfläche	15 Tage	23.11.20	11.12.20
28	Verkehrsumstellung / Einrichten Verkehrsphase 5 (Markierung geklebt)	15 Tage	08.02.21	26.02.21
29	Verkehrsphase 5, VF 4/2 FB ZH, FB SG entlang Innenrand	50 Tage	01.03.21	07.05.21
30	Verkehrsumstellung / Einrichten Verkehrsphase 6 (Markierung geklebt)	15 Tage	10.05.21	28.05.21
31	Verkehrsphase 6, VF 2/2 Abschnitt 48 entlang Aussenrändern FB SG und FB ZH	115 Tage	31.05.21	05.11.21
32	Verkehrsumstellung / "Neutralisation" und Freigabe der Verkehrsfläche	15 Tage	08.11.21	26.11.21
33	Verkehrsumstellung / Einrichten Verkehrsphase 7 (Markierung gespritzt)	15 Tage	07.02.22	25.02.22
34	Verkehrsphase 7, VF 4/0 Abschnitt 48 FB SG	85 Tage	28.02.22	24.06.22
35	Verkehrsumstellung / Einrichten Verkehrsphase 8 (Markierung geklebt)	15 Tage	27.06.22	15.07.22
36	Verkehrsphase 8, VF 4/0 Abschnitt 48 FB ZH	85 Tage	18.07.22	11.11.22
37	Verkehrsumstellung / "Neutralisation" und Freigabe der Verkehrsfläche	10 Tage	14.11.22	25.11.22
38				
39	Vorarbeiten Abschnitte 46 und 48	190 Tage	03.06.19	21.02.20
40	Bau Fundamente neue Signalportale und Montage neue Signalportale	175 Tage	03.06.19	31.01.20
41	Bau neuer Kabelrohrblock 6Ø120 Abschnitt 46	175 Tage	03.06.19	31.01.20
42	Bau Nothaltebuchten	105 Tage	03.06.19	25.10.19
43	Gerüstarbeiten Kunstbauten Abschnitt 46	35 Tage	06.01.20	21.02.20
44				
45	BAUARBEITEN BAU-/VERKEHRSPHASE 1	45 Tage	24.02.20	24.04.20
46	UNTERFÜHRUNG WINTERTHURERSTRASSE	45 Tage	24.02.20	24.04.20
47	Rückbauarbeiten und Potentialmessungen	10 Tage	24.02.20	06.03.20
48	Betoninstandsetzungen und Betonarbeiten	15 Tage	09.03.20	27.03.20
49	Epoxidharzversiegelung und PBD-Abdichtung, inkl. Entwässerungsanlagen	10 Tage	30.03.20	10.04.20
50	Belagsarbeiten, Fugenarbeiten, OS, Fahrzeugrückhaltesysteme, div. Fertigstellungsarbeiten	10 Tage	13.04.20	24.04.20
51	BRÜCKE HAMMERMÜHLE	15 Tage	09.03.20	27.03.20
52	Betoninstandsetzungen und Betonarbeiten	15 Tage	09.03.20	27.03.20
53	UNTERFÜHRUNG LAMPERGRAIN	45 Tage	24.02.20	24.04.20
54	Rückbauarbeiten und Potentialmessungen	10 Tage	24.02.20	06.03.20
55	Betoninstandsetzungen und Betonarbeiten	15 Tage	09.03.20	27.03.20
56	Epoxidharzversiegelung und PBD-Abdichtung, inkl. Entwässerungsanlagen	10 Tage	30.03.20	10.04.20
57	Belagsarbeiten, Fugenarbeiten, OS, Fahrzeugrückhaltesysteme, div. Fertigstellungsarbeiten	10 Tage	13.04.20	24.04.20
58	UNTERFÜHRUNG ROSSBERGSTRASSE	45 Tage	24.02.20	24.04.20
59	Rückbauarbeiten und Potentialmessungen	10 Tage	24.02.20	06.03.20
60	Betoninstandsetzungen und Betonarbeiten	15 Tage	09.03.20	27.03.20
61	Epoxidharzversiegelung und PBD-Abdichtung, inkl. Entwässerungsanlagen	10 Tage	30.03.20	10.04.20
62	Belagsarbeiten, Fugenarbeiten, OS, Fahrzeugrückhaltesysteme, div. Fertigstellungsarbeiten	10 Tage	13.04.20	24.04.20
63	TRASSEE	45 Tage	24.02.20	24.04.20
64	Rückbauarbeiten Mittelstreifen	20 Tage	24.02.20	20.03.20
65	Massnahmen Entwässerung und BSA-Tiefbau Mittelstreifen	20 Tage	02.03.20	27.03.20
66	Belagsarbeiten Mittelstreifen, Fahrzeugrückhaltesysteme, div. Fertigstellungsarbeiten	30 Tage	16.03.20	24.04.20
67	KLEINE INSTANDSETZUNGSMASSNAHMEN DIV. BAUWERKE	45 Tage	24.02.20	24.04.20
68	UEF SBB Riedhofstrasse (max. zulässige Arbeitszeit: 2 Wochen)	45 Tage	24.02.20	24.04.20
69	UEF Riedhofstrasse (max. zulässige Arbeitszeit: 4 Wochen)	45 Tage	24.02.20	24.04.20
70	UEF Weinbergstrasse (max. zulässige Arbeitszeit: 2 Wochen)	45 Tage	24.02.20	24.04.20
71	UNF Verzweigung Winterthur Nord (max. zulässige Arbeitszeit: 2 Wochen)	45 Tage	24.02.20	24.04.20
72	UNF Rangierbahnhof Kempttal	45 Tage	24.02.20	24.04.20
73	UNF Rossbergstrasse	45 Tage	24.02.20	24.04.20
74	UNF FG/RW Steigmühle	45 Tage	24.02.20	24.04.20
75				
76	BAUARBEITEN BAU-/VERKEHRSPHASE 2	35 Tage	04.05.20	19.06.20
77	UNTERFÜHRUNG WINTERTHURERSTRASSE	35 Tage	04.05.20	19.06.20
78	Rückbauarbeiten und Potentialmessungen	10 Tage	04.05.20	15.05.20
79	Betoninstandsetzungen und Betonarbeiten	10 Tage	18.05.20	29.05.20
80	Epoxidharzversiegelung und PBD-Abdichtung, inkl. Entwässerungsanlagen	10 Tage	01.06.20	12.06.20
81	Belagsarbeiten, Fugenarbeiten, OS, Fahrzeugrückhaltesysteme, div. Fertigstellungsarbeiten	10 Tage	08.06.20	19.06.20
82	BRÜCKE HAMMERMÜHLE	35 Tage	04.05.20	19.06.20
83	Ersatz Fahrbahnübergänge	25 Tage	04.05.20	05.06.20
84	Betoninstandsetzungen und Betonarbeiten	25 Tage	04.05.20	05.06.20
85	Belagsarbeiten, Fugenarbeiten, OS, Fahrzeugrückhaltesysteme, div. Fertigstellungsarbeiten	10 Tage	08.06.20	19.06.20
86	UNTERFÜHRUNG LAMPERGRAIN	35 Tage	04.05.20	19.06.20
87	Rückbauarbeiten und Potentialmessungen	10 Tage	04.05.20	15.05.20
88	Betoninstandsetzungen und Betonarbeiten	10 Tage	18.05.20	29.05.20
89	Epoxidharzversiegelung und PBD-Abdichtung, inkl. Entwässerungsanlagen	10 Tage	01.06.20	12.06.20
90	Belagsarbeiten, Fugenarbeiten, OS, Fahrzeugrückhaltesysteme, div. Fertigstellungsarbeiten	10 Tage	08.06.20	19.06.20
91	UNTERFÜHRUNG ROSSBERGSTRASSE	35 Tage	04.05.20	19.06.20
92	Rückbauarbeiten und Potentialmessungen	10 Tage	04.05.20	15.05.20
93	Betoninstandsetzungen und Betonarbeiten	10 Tage	18.05.20	29.05.20
94	Epoxidharzversiegelung und PBD-Abdichtung, inkl. Entwässerungsanlagen	10 Tage	01.06.20	12.06.20
95	Belagsarbeiten, Fugenarbeiten, OS, Fahrzeugrückhaltesysteme, div. Fertigstellungsarbeiten	10 Tage	08.06.20	19.06.20
96	TRASSEE	35 Tage	04.05.20	19.06.20
97	Rückbauarbeiten (Beläge, FZRS, Schachtabdeckungen, etc.)	5 Tage	04.05.20	08.05.20
98	Entwässerung (Instandsetzungen, neue Rinnen, Schächte / Schachtabdeckungen, etc.)	15 Tage	11.05.20	29.05.20
99	BSA (Kabelrohranlagen, Fundamente, Schächte / Schachtabdeckungen, etc.)	15 Tage	11.05.20	29.05.20
100	Fahrzeugrückhaltesysteme	10 Tage	18.05.20	29.05.20
101	Instandsetzungen Trag- und Binderschichten, Vorbereitungsarbeiten Deckschicht	10 Tage	25.05.20	05.06.20
102	Einbau SAMI und Deckschicht	10 Tage	01.06.20	12.06.20
103	Fertigstellungsarbeiten (Markierungen, Ränder, Aufräumarbeiten, etc.)	5 Tage	15.06.20	19.06.20
104	KLEINE INSTANDSETZUNGSMASSNAHMEN DIV. BAUWERKE	35 Tage	04.05.20	19.06.20
105	UNF Verzweigung Winterthur Nord	35 Tage	04.05.20	19.06.20
106	UNF Rangierbahnhof Kempttal	35 Tage	04.05.20	19.06.20
107	UNF Rossbergstrasse	35 Tage	04.05.20	19.06.20
108	UNF FG/RW Steigmühle	35 Tage	04.05.20	19.06.20
109				
110	BAUARBEITEN BAU-/VERKEHRSPHASE 3	55 Tage	29.06.20	11.09.20
111	UNTERFÜHRUNG WINTERTHURERSTRASSE	55 Tage	29.06.20	11.09.20
112	Rückbauarbeiten und Potentialmessungen	20 Tage	29.06.20	24.07.20
113	Betoninstandsetzungen und Betonarbeiten	25 Tage	20.07.20	21.08.20
114	Epoxidharzversiegelung und PBD-Abdichtung, inkl. Entwässerungsanlagen	10 Tage	17.08.20	28.08.20
115	Belagsarbeiten, Fugenarbeiten, OS, Fahrzeugrückhaltesysteme, div. Fertigstellungsarbeiten	10 Tage	31.08.20	11.09.20
116	BRÜCKE HAMMERMÜHLE	55 Tage	29.06.20	11.09.20
117	Ersatz Fahrbahnübergänge	40 Tage	29.06.20	21.08.20
118	Betoninstandsetzungen und Betonarbeiten	40 Tage	29.06.20	21.08.20
119	Belagsarbeiten, Fugenarbeiten, OS, Fahrzeugrückhaltesysteme, div. Fertigstellungsarbeiten	15 Tage	24.08.20	11.09.20
120	UNTERFÜHRUNG LAMPERGRAIN	55 Tage	29.06.20	11.09.20
121	Rückbauarbeiten und Potentialmessungen	20 Tage	29.06.20	24.07.20
122	Betoninstandsetzungen und Betonarbeiten	25 Tage	20.07.20	21.08.20
123	Epoxidharzversiegelung und PBD-Abdichtung, inkl. Entwässerungsanlagen	10 Tage	17.08.20	28.08.20
124	Belagsarbeiten, Fugenarbeiten, OS, Fahrzeugrückhaltesysteme, div. Fertigstellungsarbeiten	10 Tage	31.08.20	11.09.20
125	UNTERFÜHRUNG ROSSBERGSTRASSE	55 Tage	29.06.20	11.09.20
126	Rückbauarbeiten und Potentialmessungen	20 Tage	29.06.20	24.07.20
127	Betoninstandsetzungen und Betonarbeiten	25 Tage	20.07.20	21.08.20
128	Epoxidharzversiegelung und PBD-Abdichtung, inkl. Entwässerungsanlagen	10 Tage	17.08.20	28.08.20
129	Belagsarbeiten, Fugenarbeiten, OS, Fahrzeugrückhaltesysteme, div. Fertigstellungsarbeiten	10 Tage	31.08.20	11.09.20
130	TRASSEE	55 Tage	29.06.20	11.09.20
131	Rückbauarbeiten (Beläge, FZRS, Schachtabdeckungen, etc.)	5 Tage	29.06.20	03.07.20
132	Entwässerung (Instandsetzungen, neue Rinnen, Schächte / Schachtabdeckungen, etc.)	30 Tage	06.07.20	14.08.20
133	BSA (Kabelrohranlagen, Fundamente, Schächte / Schachtabdeckungen, etc.)	30 Tage	06.07.20	14.08.20
134	Fahrzeugrückhaltesysteme	20 Tage	20.07.20	14.08.20
135	Instandsetzungen Trag- und Binderschichten, Vorbereitungsarbeiten Deckschicht	10 Tage	10.08.20	21.08.20
136	Einbau SAMI und Deckschicht	10 Tage	24.08.20	04.09.20
137	Fertigstellungsarbeiten (Markierungen, Ränder, Aufräumarbeiten, etc.)	5 Tage	07.09.20	11.09.20
138	KLEINE INSTANDSETZUNGSMASSNAHMEN DIV. BAUWERKE	55 Tage	29.06.20	11.09.20
139	UNF Verzweigung Winterthur Nord	55 Tage	29.06.20	11.09.20
140	UNF Rampe Einfahrt Rtg. ZH, Anschluss Effretikon (max. zulässige Arbeitszeit: 2 Wochen)	55 Tage	29.06.20	11.09.20
141	UNF Rangierbahnhof Kempttal	55 Tage	29.06.20	11.09.20
142	UNF Rossbergstrasse	55 Tage	29.06.20	11.09.20
143	UNF FG/RW Steigmühle	55 Tage	29.06.20	11.09.20
144	SM Steigmühle	55 Tage	29.06.20	11.09.20
145				
146	BAUARBEITEN BAU-/VERKEHRSPHASE 4	40 Tage	28.09.20	20.11.20
147	UNTERFÜHRUNG WINTERTHURERSTRASSE	40 Tage	28.09.20	20.11.20
148	Rückbauarbeiten und Potentialmessungen	10 Tage	28.09.20	09.10.20
149	Betoninstandsetzungen und Betonarbeiten	10 Tage	12.10.20	23.10.20
150	Epoxidharzversiegelung und PBD-Abdichtung, inkl. Entwässerungsanlagen	10 Tage	26.10.20	06.11.20
151	Belagsarbeiten, Fugenarbeiten, OS, Fahrzeugrückhaltesysteme, div. Fertigstellungsarbeiten	10 Tage	09.11.20	20.11.20
152	BRÜCKE HAMMERMÜHLE	40 Tage	28.09.20	20.11.20
153	Ersatz Fahrbahnübergänge	30 Tage	28.09.20	06.11.20
154	Betoninstandsetzungen und Betonarbeiten	30 Tage	28.09.20	06.11.20
155	Belagsarbeiten, Fugenarbeiten, OS, Fahrzeugrückhaltesysteme, div. Fertigstellungsarbeiten	10 Tage	09.11.20	20.11.20
156	UNTERFÜHRUNG LAMPERGRAIN	40 Tage	28.09.20	20.11.20
157	Rückbauarbeiten und Potentialmessungen	10 Tage	28.09.20	09.10.20
158	Betoninstandsetzungen und Betonarbeiten	10 Tage	12.10.20	23.10.20
159	Epoxidharzversiegelung und PBD-Abdichtung, inkl. Entwässerungsanlagen	10 Tage	26.10.20	06.11.20
160	Belagsarbeiten, Fugenarbeiten, OS, Fahrzeugrückhaltesysteme, div. Fertigstellungsarbeiten	10 Tage	09.11.20	20.11.20
161	UNTERFÜHRUNG ROSSBERGSTRASSE	40 Tage	28.09.20	20.11.20
162	Rückbauarbeiten und Potentialmessungen	10 Tage	28.09.20	09.10.20
163	Betoninstandsetzungen und Betonarbeiten	10 Tage	12.10.20	23.10.20
164	Epoxidharzversiegelung und PBD-Abdichtung, inkl. Entwässerungsanlagen	10 Tage	26.10.20	06.11.20
165	Belagsarbeiten, Fugenarbeiten, OS, Fahrzeugrückhaltesysteme, div. Fertigstellungsarbeiten	10 Tage	09.11.20	20.11.20
166	TRASSEE	40 Tage	28.09.20	20.11.20
167	Rückbauarbeiten (Beläge, FZRS, Schachtabdeckungen, etc.)	5 Tage	28.09.20	02.10.20
168	Entwässerung (Instandsetzungen, neue Rinnen, Schächte / Schachtabdeckungen, etc.)	15 Tage	05.10.20	23.10.20
169	BSA (Kabelrohranlagen, Fundamente, Schächte / Schachtabdeckungen, etc.)	15 Tage	05.10.20	23.10.20
170	Fahrzeugrückhaltesysteme	10 Tage	12.10.20	23.10.20
171	Instandsetzungen Trag- und Binderschichten, Vorbereitungsarbeiten Deckschicht	10 Tage	19.10.20	30.10.20
172	Einbau SAMI und Deckschicht	10 Tage	02.11.20	13.11.20
173	Fertigstellungsarbeiten (Markierungen, Ränder, Aufräumarbeiten, etc.)	5 Tage	16.11.20	20.11.20
174	KLEINE INSTANDSETZUNGSMASSNAHMEN DIV. BAUWERKE	40 Tage	28.09.20	20.11.20
175	UNF Verzweigung Winterthur Nord	40 Tage	28.09.20	20.11.20
176	UNF Rangierbahnhof Kempttal	40 Tage	28.09.20	20.11.20
177	UNF Rossbergstrasse	40 Tage	28.09.20	20.11.20
178	UNF FG/RW Steigmühle	40 Tage	28.09.20	20.11.20
179				
180	BAUARBEITEN BAU-/VERKEHRSPHASE 5	50 Tage	01.03.21	07.05.21
181	UNTERFÜHRUNG WINTERTHURERSTRASSE	50 Tage	01.03.21	07.05.21
182	Rückbauarbeiten und Potentialmessungen	15 Tage	01.03.21	19.03.21
183	Betoninstandsetzungen und Betonarbeiten	20 Tage	15.03.21	09.04.21
184	Epoxidharzversiegelung und PBD-Abdichtung, inkl. Entwässerungsanlagen	10 Tage	12.04.21	23.04.21
185	Belagsarbeiten, Fugenarbeiten, OS, Fahrzeugrückhaltesysteme, div. Fertigstellungsarbeiten	10 Tage	26.04.21	07.05.21
186	BRÜCKE HAMMERMÜHLE	50 Tage	01.03.21	07.05.21
187	Ersatz Fahrbahnübergänge	40 Tage	01.03.21	23.04.21
188	Betoninstandsetzungen und Betonarbeiten	40 Tage	01.03.21	23.04.21
189	Belagsarbeiten, Fugenarbeiten, OS, Fahrzeugrückhaltesysteme, div. Fertigstellungsarbeiten	10 Tage	26.04.21	07.05.21
190	UNTERFÜHRUNG SBB LAMPERGRAIN	50 Tage	01.03.21	07.05.21
191	Rückbauarbeiten und Potentialmessungen	15 Tage	01.03.21	19.03.21
192	Betoninstandsetzungen und Betonarbeiten	20 Tage	15.03.21	09.04.21
193	Epoxidharzversiegelung und PBD-Abdichtung, inkl. Entwässerungsanlagen	10 Tage	12.04.21	23.04.21
194	Belagsarbeiten, Fugenarbeiten, OS, Fahrzeugrückhaltesysteme, div. Fertigstellungsarbeiten	10 Tage	26.04.21	07.05.21
195	UNTERFÜHRUNG ROSSBERGSTRASSE	50 Tage	01.03.21	07.05.21
196	Rückbauarbeiten und Potentialmessungen	15 Tage	01.03.21	19.03.21
197	Betoninstandsetzungen und Betonarbeiten	20 Tage	15.03.21	09.04.21
198	Epoxidharzversiegelung und PBD-Abdichtung, inkl. Entwässerungsanlagen	10 Tage	12.04.21	23.04.21
199	Belagsarbeiten, Fugenarbeiten, OS, Fahrzeugrückhaltesysteme, div. Fertigstellungsarbeiten	10 Tage	26.04.21	07.05.21
200	TRASSEE	50 Tage	01.03.21	07.05.21
201	Rückbauarbeiten (Beläge, FZRS, Schachtabdeckungen, etc.)	5 Tage	01.03.21	05.03.21
202	Entwässerung (Instandsetzungen, neue Rinnen, Schächte / Schachtabdeckungen, etc.)	15 Tage	08.03.21	26.03.21
203	BSA (Kabelrohranlagen, Fundamente, Schächte / Schachtabdeckungen, etc.)	15 Tage	08.03.21	26.03.21
204	Fahrzeugrückhaltesysteme	10 Tage	22.03.21	02.04.21
205	Instandsetzungen Trag- und Binderschichten, Vorbereitungsarbeiten Deckschicht	10 Tage	05.04.21	16.04.21
206	Einbau SAMI und Deckschicht	10 Tage	19.04.21	30.04.21
207	Fertigstellungsarbeiten (Markierungen, Ränder, Aufräumarbeiten, etc.)	5 Tage	03.05.21	07.05.21
208	KLEINE INSTANDSETZUNGSMASSNAHMEN DIV. BAUWERKE	50 Tage	01.03.21	07.05.21
209	UNF Verzweigung Winterthur Nord	50 Tage	01.03.21	07.05.21
210	UNF Rampe Einfahrt Rtg. ZH, Anschluss Effretikon (max. zulässige Arbeitszeit: 2 Wochen)	50 Tage	01.03.21	07.05.21
211	UNF Rangierbahnhof Kempttal	50 Tage	01.03.21	07.05.21
212	UNF Rossbergstrasse	50 Tage	01.03.21	07.05.21
213	UNF FG/RW Steigmühle	50 Tage	01.03.21	07.05.21
214	SM Hammermühle	50 Tage	01.03.21	07.05.21
215				
216	BAUARBEITEN BAU-/VERKEHRSPHASE 6	115 Tage	31.05.21	05.11.21
217	ÜBERDECKUNG TÖSS	105 Tage	31.05.21	22.10.21
218	Umbau Mittelstreifen	80 Tage	31.05.21	17.09.21
219	Ersatz Fahrbahnübergang	80 Tage	31.05.21	17.09.21
220	Deckbelagsersatz	20 Tage	27.09.21	22.10.21
221	UNTERFÜHRUNG SBB WOLFBÜEL	115 Tage	31.05.21	05.11.21
222	Rückbauarbeiten Anpassung Mittelstreifen (MS)	15 Tage	31.05.21	18.06.21
223	Betoninstandsetzungen und Betonarbeiten MS	60 Tage	21.06.21	10.09.21
224	Epoxidharzversiegelung und PBD-Abdichtung, inkl. Entwässerungsanlagen MS	20 Tage	30.08.21	24.09.21
225	Belagsarbeiten, Fugenarbeiten, OS, Fahrzeugrückhaltesysteme, div. Fertigstellungsarbeiten MS	30 Tage	27.09.21	05.11.21
226	UNTERFÜHRUNG WIESHOFSTRASSE	115 Tage	31.05.21	05.11.21
227	Rückbauarbeiten Anpassung Mittelstreifen (MS)	15 Tage	31.05.21	18.06.21
228	Betoninstandsetzungen und Betonarbeiten MS	60 Tage	21.06.21	10.09.21
229	Epoxidharzversiegelung und PBD-Abdichtung, inkl. Entwässerungsanlagen MS	20 Tage	30.08.21	24.09.21
230	Belagsarbeiten, Fugenarbeiten, OS, Fahrzeugrückhaltesysteme, div. Fertigstellungsarbeiten MS	30 Tage	27.09.21	05.11.21
231	BRÜCKE EULACH	115 Tage	31.05.21	05.11.21
232	Rückbauarbeiten Anpassung Mittelstreifen (MS)	15 Tage	31.05.21	18.06.21
233	Betoninstandsetzungen und Betonarbeiten MS	60 Tage	21.06.21	10.09.21
234	Epoxidharzversiegelung und PBD-Abdichtung, inkl. Entwässerungsanlagen MS	20 Tage	30.08.21	24.09.21
235	Belagsarbeiten, Fugenarbeiten, OS, Fahrzeugrückhaltesysteme, div. Fertigstellungsarbeiten MS	30 Tage	27.09.21	05.11.21
236	ÜBERFÜHRUNG WÄSSERWIESENSTRASSE	15 Tage	31.05.21	18.06.21
237	Betoninstandsetzungen am Unterbau	15 Tage	31.05.21	18.06.21
238	TRASSEE	115 Tage	31.05.21	05.11.21
239	Rückbauarbeiten (Beläge, FZRS, Schachtabdeckungen, etc.) Anpassung Mittelstreifen (MS)	15 Tage	31.05.21	18.06.21
240	Entwässerung (Instandsetzungen, neue Rinnen, Schächte / Schachtabdeckungen, etc.) MS	60 Tage	14.06.21	03.09.21
241	BSA (Kabelrohranlagen, Fundamente, Schächte / Schachtabdeckungen, etc.) MS	60 Tage	14.06.21	03.09.21
242	Versetzen Randabschlüsse MS	40 Tage	12.07.21	03.09.21
243	Fahrzeugrückhaltesysteme MS	25 Tage	23.08.21	24.09.21
244	Belagsarbeiten, Fugenarbeiten, div. Fertigstellungsarbeiten MS	30 Tage	27.09.21	05.11.21
245	KLEINE INSTANDSETZUNGSMASSNAHMEN DIV. BAUWERKE	115 Tage	31.05.21	05.11.21
246	UNF Salomon-Hirzelstrasse (max. zulässige Arbeitszeit: 2 Wochen)	115 Tage	31.05.21	05.11.21
247	UNF Schlachthofstrasse	115 Tage	31.05.21	05.11.21
248				
249	BAUARBEITEN BAU-/VERKEHRSPHASE 7	115 Tage	17.01.22	24.06.22
250	ÜBERDECKUNG TÖSS	85 Tage	28.02.22	24.06.22
251	Erhöhung KK und Anpassung FB ZH	55 Tage	28.02.22	13.05.22
252	Ersatz Fahrbahnübergänge	60 Tage	28.02.22	20.05.22
253	Deckbelagsersatz	20 Tage	23.05.22	17.06.22
254	Diverse Arbeiten	25 Tage	23.05.22	24.06.22
255	UNTERFÜHRUNG SBB WOLFBÜEL	85 Tage	28.02.22	24.06.22
256	Rückbauarbeiten und Potentialmessungen FB ZH	15 Tage	28.02.22	18.03.22
257	Betoninstandsetzungen, Betonarbeiten und Ersatz Fahrbahnübergänge FB ZH	40 Tage	14.03.22	06.05.22
258	Epoxidharzversiegelung und PBD-Abdichtung, inkl. Entwässerungsanlagen FB ZH	20 Tage	02.05.22	27.05.22
259	Belagsarbeiten, Fugenarbeiten, OS, Fahrzeugrückhaltesysteme, div. Fertigstellungsarbeiten FB ZH	20 Tage	30.05.22	24.06.22
260	UNTERFÜHRUNG WIESHOFSTRASSE	85 Tage	28.02.22	24.06.22
261	Rückbauarbeiten und Potentialmessungen FB ZH	15 Tage	28.02.22	18.03.22
262	Betoninstandsetzungen, Betonarbeiten und Ersatz Fahrbahnübergänge FB ZH	40 Tage	14.03.22	06.05.22
263	Epoxidharzversiegelung und PBD-Abdichtung, inkl. Entwässerungsanlagen FB ZH	20 Tage	02.05.22	27.05.22
264	Belagsarbeiten, Fugenarbeiten, OS, Fahrzeugrückhaltesysteme, div. Fertigstellungsarbeiten FB ZH	20 Tage	30.05.22	24.06.22
265	BRÜCKE EULACH	85 Tage	28.02.22	24.06.22
266	Rückbauarbeiten und Potentialmessungen FB ZH	15 Tage	28.02.22	18.03.22
267	Betoninstandsetzungen, Betonarbeiten und Ersatz Fahrbahnübergänge FB ZH	40 Tage	14.03.22	06.05.22
268	Epoxidharzversiegelung und PBD-Abdichtung, inkl. Entwässerungsanlagen FB ZH	20 Tage	02.05.22	27.05.22
269	Belagsarbeiten, Fugenarbeiten, OS, Fahrzeugrückhaltesysteme, div. Fertigstellungsarbeiten FB ZH	20 Tage	30.05.22	24.06.22
270	ÜBERFÜHRUNG WÄSSERWIESENSTRASSE	115 Tage	17.01.22	24.06.22
271	Gerüstarbeiten	15 Tage	17.01.22	04.02.22
272	Rückbauarbeiten und Potentialmessungen FB ZH	15 Tage	28.02.22	18.03.22
273	Betoninstandsetzungen, Betonarbeiten und Ersatz Fahrbahnübergänge FB ZH	40 Tage	14.03.22	06.05.22
274	Epoxidharzversiegelung und PBD-Abdichtung, inkl. Entwässerungsanlagen FB ZH	20 Tage	02.05.22	27.05.22
275	Belagsarbeiten, Fugenarbeiten, OS, Fahrzeugrückhaltesysteme, div. Fertigstellungsarbeiten FB ZH	20 Tage	30.05.22	24.06.22
276	TRASSEE	85 Tage	28.02.22	24.06.22
277	Rückbauarbeiten (Beläge, FZRS, Schachtabdeckungen, etc.)	15 Tage	28.02.22	18.03.22
278	Entwässerung (Instandsetzungen, neue Rinnen, Schächte / Schachtabdeckungen, etc.)	30 Tage	14.03.22	22.04.22
279	BSA (Kabelrohranlagen, Fundamente, Schächte / Schachtabdeckungen, etc.)	30 Tage	14.03.22	22.04.22
280	Fahrzeugrückhaltesysteme und Anpassungen Leitmauern	30 Tage	11.04.22	20.05.22
281	Trasseeanpassung Bereich Drainbelag und Anpassungen Quergefälle PS	25 Tage	18.04.22	20.05.22
282	Instandsetzungen Trag- und Binderschichten, Vorbereitungsarbeiten Deckschicht	15 Tage	02.05.22	20.05.22
283	Einbau SAMI und Deckschicht	15 Tage	23.05.22	10.06.22
284	Fertigstellungsarbeiten (Markierungen, Ränder, Aufräumarbeiten, etc.)	15 Tage	06.06.22	24.06.22
285	KLEINE INSTANDSETZUNGSMASSNAHMEN DIV. BAUWERKE	85 Tage	28.02.22	24.06.22
286	UNF Salomon-Hirzelstrasse (max. zulässige Arbeitszeit: 6 Wochen)	85 Tage	28.02.22	24.06.22
287	UEF Holzlegistrasse (max. zulässige Arbeitszeit: 2 Wochen)	85 Tage	28.02.22	24.06.22
288	UEF Wülflingerstrasse (max. zulässige Arbeitszeit: 4 Wochen)	85 Tage	28.02.22	24.06.22
289	UNF Schlachthofstrasse	85 Tage	28.02.22	24.06.22
290				
291	BAUARBEITEN BAU-/VERKEHRSPHASE 8	85 Tage	18.07.22	11.11.22
292	ÜBERDECKUNG TÖSS	75 Tage	18.07.22	28.10.22
293	Ersatz der Einlaufschächte	30 Tage	18.07.22	26.08.22
294	Anpassung RLM FB SG	50 Tage	01.08.22	07.10.22
295	Ersatz Fahrbahnübergänge	60 Tage	18.07.22	07.10.22
296	Deckbelagsersatz	20 Tage	03.10.22	28.10.22
297	Diverse Arbeiten	45 Tage	29.08.22	28.10.22
298	UNTERFÜHRUNG SBB WOLFBÜEL	85 Tage	18.07.22	11.11.22
299	Rückbauarbeiten und Potentialmessungen FB ZH	15 Tage	18.07.22	05.08.22
300	Betoninstandsetzungen, Betonarbeiten und Ersatz Fahrbahnübergänge FB ZH	40 Tage	01.08.22	23.09.22
301	Epoxidharzversiegelung und PBD-Abdichtung, inkl. Entwässerungsanlagen FB ZH	20 Tage	19.09.22	14.10.22
302	Belagsarbeiten, Fugenarbeiten, OS, Fahrzeugrückhaltesysteme, div. Fertigstellungsarbeiten FB ZH	20 Tage	17.10.22	11.11.22
303	UNTERFÜHRUNG WIESHOFSTRASSE	85 Tage	18.07.22	11.11.22
304	Rückbauarbeiten und Potentialmessungen FB ZH	15 Tage	18.07.22	05.08.22
305	Betoninstandsetzungen, Betonarbeiten und Ersatz Fahrbahnübergänge FB ZH	40 Tage	01.08.22	23.09.22
306	Epoxidharzversiegelung und PBD-Abdichtung, inkl. Entwässerungsanlagen FB ZH	20 Tage	19.09.22	14.10.22
307	Belagsarbeiten, Fugenarbeiten, OS, Fahrzeugrückhaltesysteme, div. Fertigstellungsarbeiten FB ZH	20 Tage	17.10.22	11.11.22
308	BRÜCKE EULACH	85 Tage	18.07.22	11.11.22
309	Rückbauarbeiten und Potentialmessungen FB ZH	15 Tage	18.07.22	05.08.22
310	Betoninstandsetzungen, Betonarbeiten und Ersatz Fahrbahnübergänge FB ZH	40 Tage	01.08.22	23.09.22
311	Epoxidharzversiegelung und PBD-Abdichtung, inkl. Entwässerungsanlagen FB ZH	20 Tage	19.09.22	14.10.22
312	Belagsarbeiten, Fugenarbeiten, OS, Fahrzeugrückhaltesysteme, div. Fertigstellungsarbeiten FB ZH	20 Tage	17.10.22	11.11.22
313	ÜBERFÜHRUNG WÄSSERWIESENSTRASSE	15 Tage	18.07.22	05.08.22
314	Oberflächenschutz	15 Tage	18.07.22	05.08.22
315	TRASSEE	85 Tage	18.07.22	11.11.22
316	Rückbauarbeiten (Beläge, FZRS, Schachtabdeckungen, etc.)	15 Tage	18.07.22	05.08.22
317	Entwässerung (Instandsetzungen, neue Rinnen, Schächte / Schachtabdeckungen, etc.)	30 Tage	01.08.22	09.09.22
318	BSA (Kabelrohranlagen, Fundamente, Schächte / Schachtabdeckungen, etc.)	30 Tage	01.08.22	09.09.22
319	Fahrzeugrückhaltesysteme und Anpassungen Leitmauern	30 Tage	29.08.22	07.10.22
320	Trasseeanpassung Bereich Drainbelag und Anpassungen Quergefälle PS	25 Tage	05.09.22	07.10.22
321	Instandsetzungen Trag- und Binderschichten, Vorbereitungsarbeiten Deckschicht	15 Tage	19.09.22	07.10.22
322	Einbau SAMI und Deckschicht	15 Tage	10.10.22	28.10.22
323	Fertigstellungsarbeiten (Markierungen, Ränder, Aufräumarbeiten, etc.)	15 Tage	24.10.22	11.11.22
324	KLEINE INSTANDSETZUNGSMASSNAHMEN DIV. BAUWERKE	85 Tage	18.07.22	11.11.22
325	UNF Salomon-Hirzelstrasse (max. zulässige Arbeitszeit: 6 Wochen)	85 Tage	18.07.22	11.11.22
326	UEF Holzlegistrasse (max. zulässige Arbeitszeit: 2 Wochen)	85 Tage	18.07.22	11.11.22
327	UEF Wülflingerstrasse (max. zulässige Arbeitszeit: 4 Wochen)	85 Tage	18.07.22	11.11.22
328	UNF Schlachthofstrasse	85 Tage	18.07.22	11.11.22

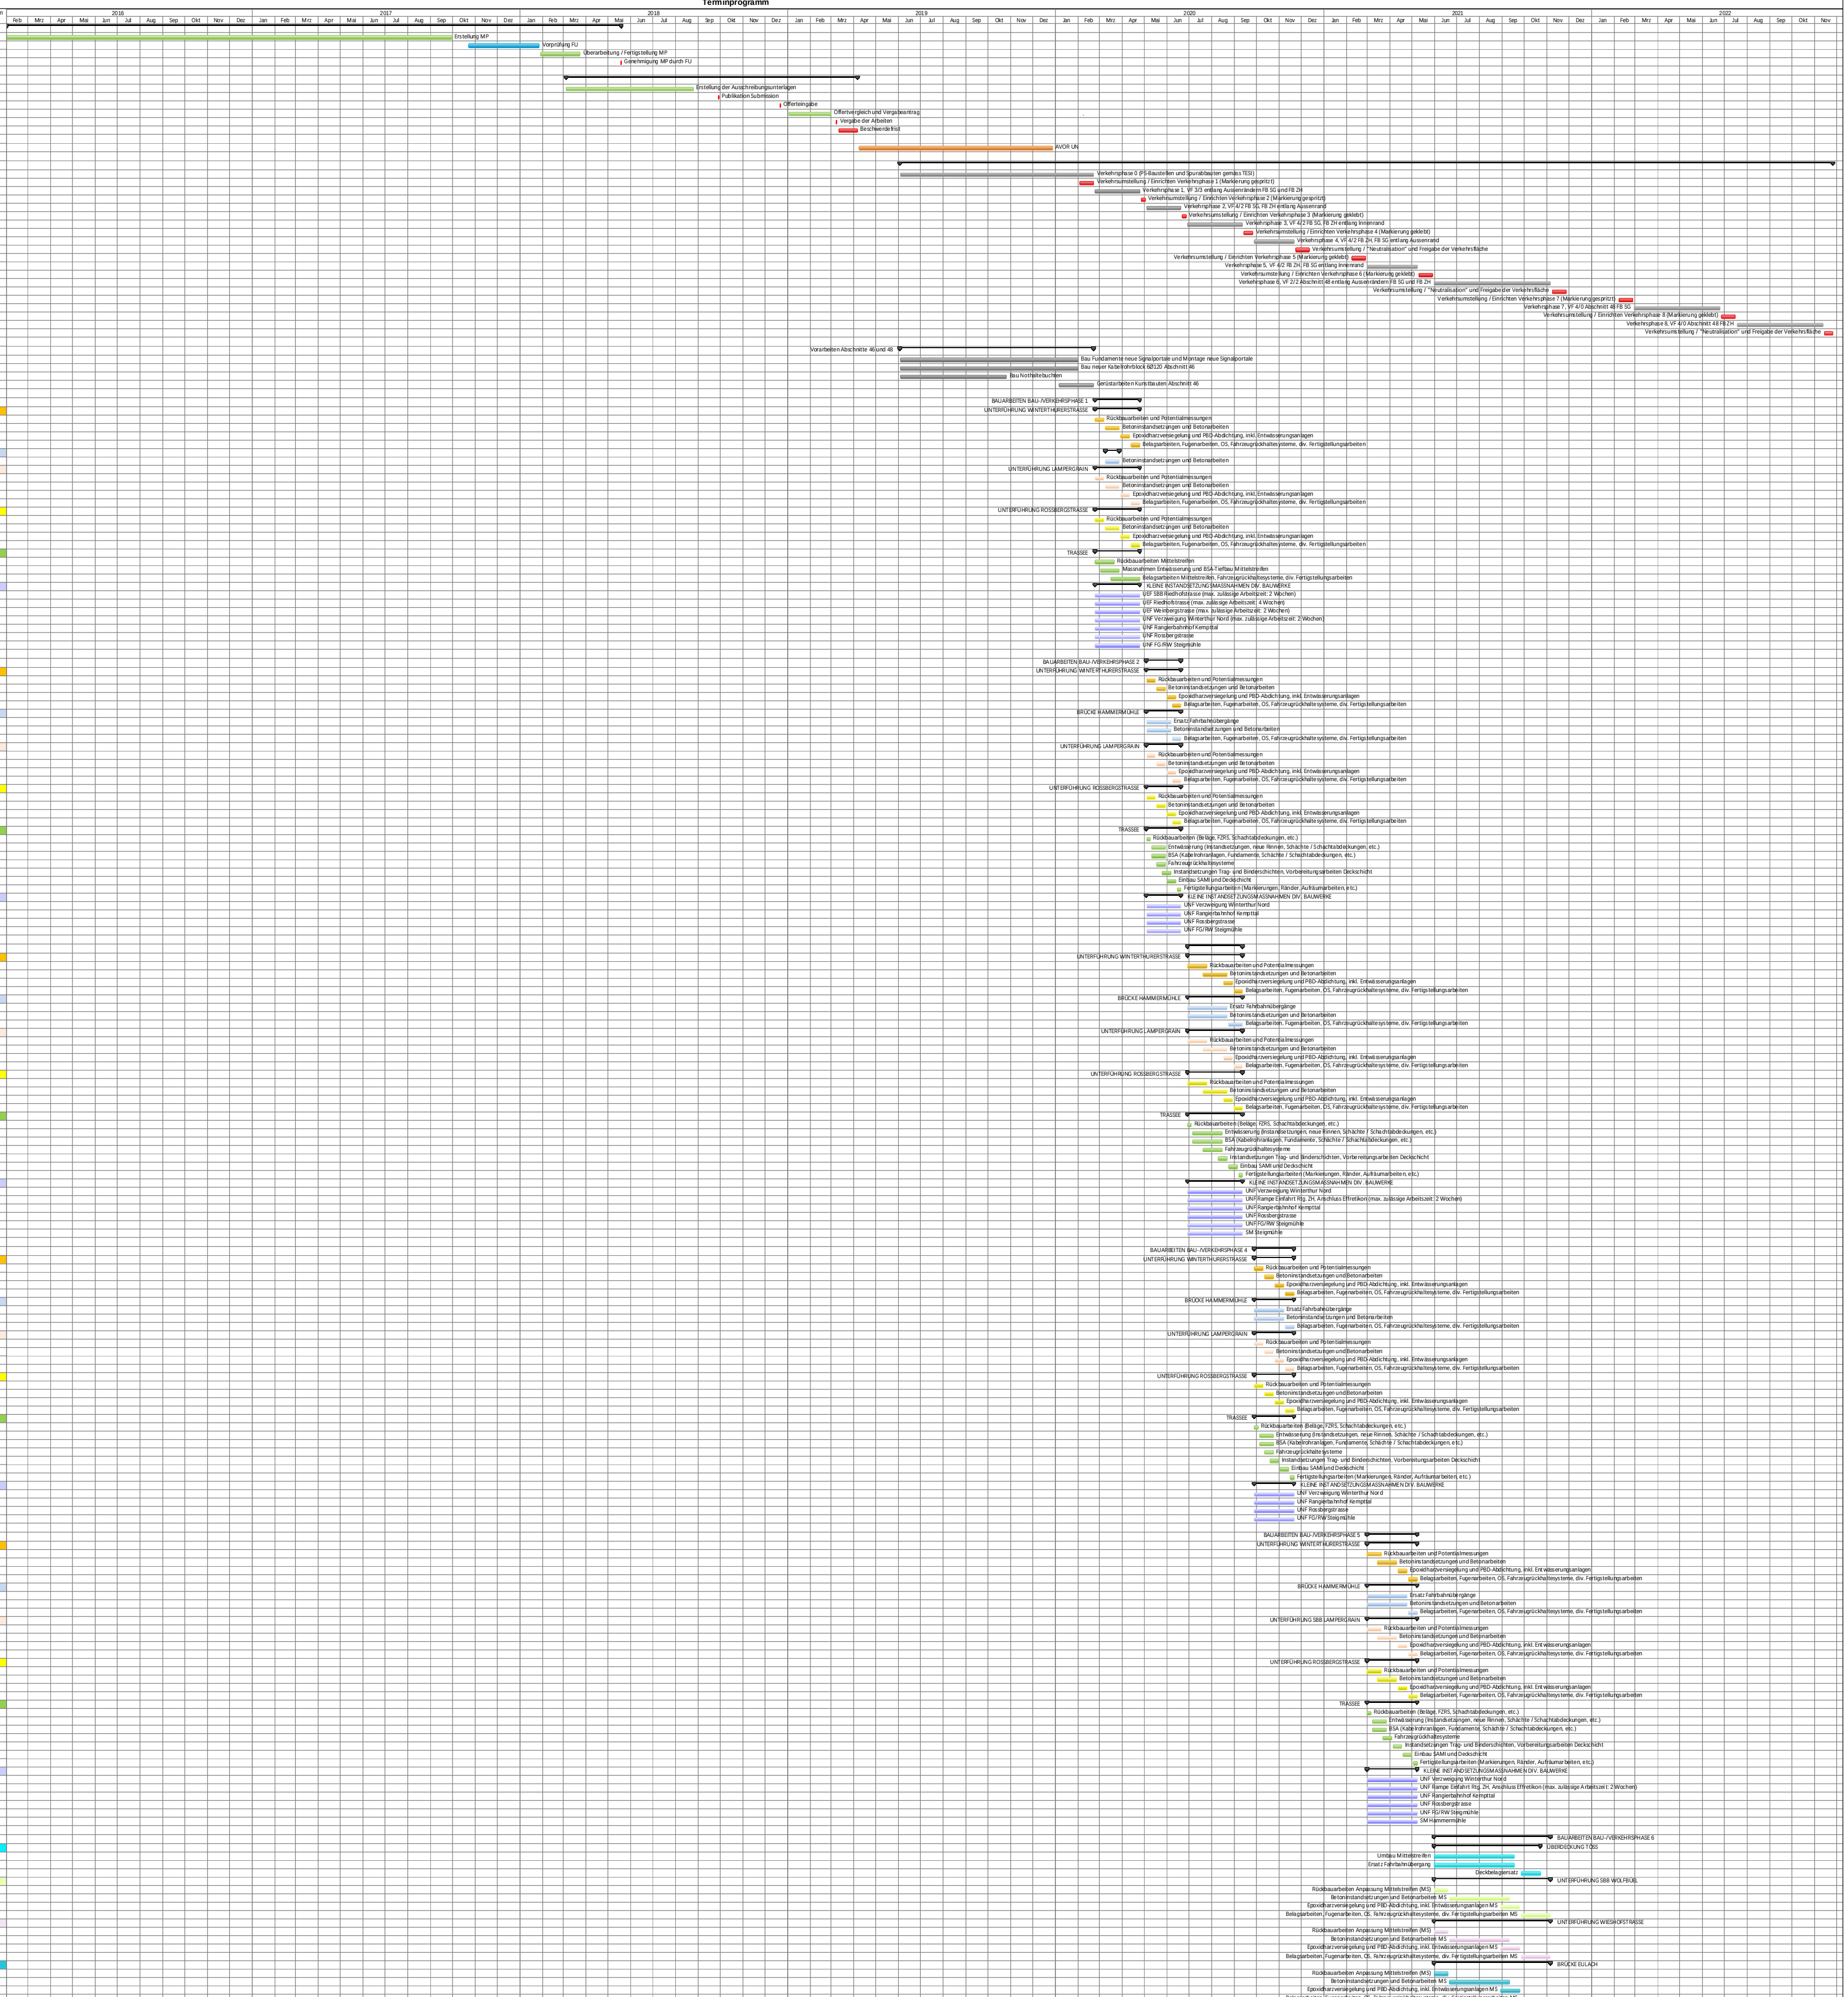

IG Töss
c/o F. Preisig AG, Grünhaldenstrasse 6, 8050 Zürich

Zürich, 30.09.2017
