Gesamtrahmenterminplan UW Volta

Stand Vorprojekt

Bauherr: IWB
Sanierung und Umbau UW Volta
Bouygues E EnerTRansAG (Gesamtleitung)
Rapp Architekten AG (Bau)

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Start Projekt**	0 fMonate	Fre 29.03.19	Fre 29.03.19
2	Beschaffungsprozess Planungsleistungen	7 fMonate	Fre 29.03.19	Fre 25.10.19
3	Vergabe Planungsleistungen ab Phase 32	0 fMonate	Fre 25.10.19	Fre 25.10.19
4	Phase 32 Bauprojekt	5 fMonate	Fre 25.10.19	Mon 23.03.20
5	**Phase 33 Bewilligungsprojekt**	**4.3 Monate**	**Mon 23.03.2**	**Don 20.08.20**
6	Unterlagen ausarbeiten	2 fMonate	Mon 23.03.2	Fre 22.05.20
7	Esti Bewilligung	5 fMonate	Mon 23.03.2	Don 20.08.20
8	Vorliegen Baubewilligung	0 fMonate	Don 20.08.2	Don 20.08.20
9	**Phase 41 Ausschreibung inkl. Vergabe**	**18 Monate**	**Fre 22.05.20**	**Fre 11.02.22**
10	**Baumeister**	**10.25 Monate**	**Fre 22.05.20**	**Mon 17.05.21**
11	Vergabe	9 fMonate	Fre 22.05.20	Die 16.02.21
12	Vorlaufzeit, Arbeitsvorbereitung	3 fMonate	Die 16.02.21	Mon 17.05.21
13	**elektrische Anlagen**	**18 Monate**	**Fre 22.05.20**	**Fre 11.02.22**
14	Ausschreibung bis Vergabe	9 fMonate	Fre 22.05.20	Die 16.02.21
15	**Lieferfristen**	**10.35 Monate**	**Die 16.02.21**	**Fre 11.02.22**
16	Anlagen	12 fMonate	Die 16.02.21	Fre 11.02.22
17	Planungsgrundlagen	2 fMonate	Die 16.02.21	Sam 17.04.21
18	**Phase 51 Ausführungsplanung**	**4.2 Monate**	**Sam 17.04.2**	**Die 14.09.21**
19	Ausführungsplanung Bauetappe 1	5 fMonate	Sam 17.04.2	Die 14.09.21
20	Phase 52 Start Ausführung	0 fMonate	Mon 17.05.2	Mon 17.05.21
21	**Realisierung Etappe 1**	**34.4 Monate**	**Mon 17.05.2**	**Mon 02.09.24**
22	1a Bauetappe Abbruch LK oberirdisch	3 fMonate	Mon 17.05.2	Son 15.08.21
23	1b Bauetappe Archäologische Grabungen inkl. Altlastensanierung	4 fMonate	Son 15.08.21	Mon 13.12.21
24	**Bauetappe 1**	**18.8 Monate**	**Mon 13.12.2**	**Mon 02.10.23**
25	1c Bauetappe 12kV Anbau UG Rohbau	3 fMonate	Mon 13.12.2	Son 13.03.22
26	1c Bauetappe 12kV Anbau Ausbau	2 fMonate	Son 13.03.2	Don 12.05.22
27	1d Bauetappe Längsbau L1 Abbruch/Rohbau	12 fMonate	Die 04.01.22	Fre 30.12.22
28	1d Bauetappe Längsbau L1 Ausbau	6 fMonate	Fre 30.12.22	Mit 28.06.23
29	1e Bauetappe 12kV Anbau oberirdisch Rohbau	5 fMonate	Fre 16.09.22	Mon 13.02.23
30	1e Bauetappe 12kV Anbau oberirdisch Ausbau	4 fMonate	Mon 13.02.2	Die 13.06.23
31	1f Bauetappe Abbruch/Rohbau Trafozellen I+II	5 fMonate	Die 06.12.22	Fre 05.05.23
32	1f Bauetappe Ausbau Trafozellen I+II	5 fMonate	Fre 05.05.23	Mon 02.10.23
33	1g BauetappeAusbau Montagehalle, Trafogang, LB1	5 fMonate	Fre 05.05.23	Mon 02.10.23
34	**Anlagenetappe 1**	**9.6 Monate**	**Mon 02.10.2**	**Mon 02.09.24**
64	Abschluss Etappe 1	0 fMonate	Mon 02.09.2	Mon 02.09.24
65	Start Etappe 2	0 fMonate	Mon 02.09.2	Mon 02.09.24
66	**Realisierung Etappe 2**	**4 Monate**	**Mon 02.09.2**	**Sam 18.01.25**
67	Rückbau Trafo III	1 fMonat	Mon 02.09.2	Mit 02.10.24
68	**Bauetappe 2**	**1.8 Monate**	**Mon 02.09.2**	**Fre 01.11.24**
69	2a Bauetappe Abbruch, Rohbau Trafozelle III	1 fMonat	Mon 02.09.2	Mit 02.10.24
70	2a Bauetappe Ausbau Trafozelle III	1 fMonat	Mit 02.10.24	Fre 01.11.24
71	**Anlagenetappe 2**	**2.2 Monate**	**Fre 01.11.24**	**Sam 18.01.25**
83	Abschluss Etappe 2	0 fMonate	Sam 18.01.2	Sam 18.01.25
84	Start Etappe 3	0 fMonate	Sam 18.01.2	Sam 18.01.25
85	**Realisierung Etappe 3**	**17.4 Monate**	**Sam 18.01.2**	**Die 22.09.26**
86	Rückbau 145kV Anlage, Trafos IV, V	3 fMonate	Sam 18.01.2	Fre 18.04.25
87	**Bauetappe 3**	**5.1 Monate**	**Fre 18.04.25**	**Mit 15.10.25**
88	3a Bauetappe, Ausbau LB2	3 fMonate	Don 17.07.2	Mit 15.10.25
89	3a Bauetappe, Stahlbau, Rohbau LB2	3 fMonate	Fre 18.04.25	Don 17.07.25
90	3b Bauetappe Rohbau Trafozelle IV, V	1 fMonat	Don 17.07.2	Sam 16.08.25
91	3b Bauetappe Ausbau Trafozellen IV, V	1 fMonat	Sam 16.08.2	Mon 15.09.25
92	**Anlagenetappe 3**	**10.6 Monate**	**Mon 15.09.2**	**Die 22.09.26**
117	Abschluss Etappe 3	0 fMonate	Die 22.09.26	Die 22.09.26
118	Start Etappe 4	0 fMonate	Die 22.09.26	Die 22.09.26
119	**Realisierung Etappe 4**	**18 Monate**	**Die 22.09.26**	**Die 13.06.28**
120	Räumung	2 fMonate	Die 22.09.26	Sam 21.11.26
121	**Bauetappe 4**	**10.35 Monate**	**Die 22.09.26**	**Fre 17.09.27**
122	4a Bauetappe, Nordkuben N1 und N2, Schadstoffsanierung, Abbruch	6 fMonate	Die 22.09.26	Son 21.03.27
123	Abschluss Rückbau Nordkuben	0 fMonate	Son 21.03.27	Son 21.03.27
124	4a Bauetappe, N1 und N2, Rohbau, Deckenverstärkunge	4 fMonate	Son 21.03.27	Mon 19.07.27
125	4a Bauetappe, N1 und N2 Ausbau	2 fMonate	Mon 19.07.2	Fre 17.09.27
126	**Anlagenetappe 4**	**7.65 Monate**	**Fre 17.09.27**	**Die 13.06.28**
131	Abschluss Etappe 4	0 fMonate	Die 13.06.28	Die 13.06.28
132	Start Etappe 5	0 fMonate	Die 13.06.28	Die 13.06.28
133	**Realisierung Etappe 5**	**3.45 Monate**	**Die 13.06.28**	**Mit 11.10.28**
134	Räumung	2 fMonate	Die 13.06.28	Sam 12.08.28
135	**Bauetappe 5**	**1.65 Monate**	**Sam 12.08.2**	**Mit 11.10.28**
136	5a Bauetappe Bezirks-GL Station, Rückbau	1 fMonat	Sam 12.08.2	Mon 11.09.28
137	5a Bauetappe Bezirks-GL Station Ausbau	1 fMonat	Mon 11.09.2	Mit 11.10.28
138	**Bauetappe 6, Umgebung, Fertigstellung**	3 fMonate	Don 13.07.2	Mit 11.10.28
139	Fertigstellung Projekt	0 fMonate	Mit 11.10.28	Mit 11.10.28

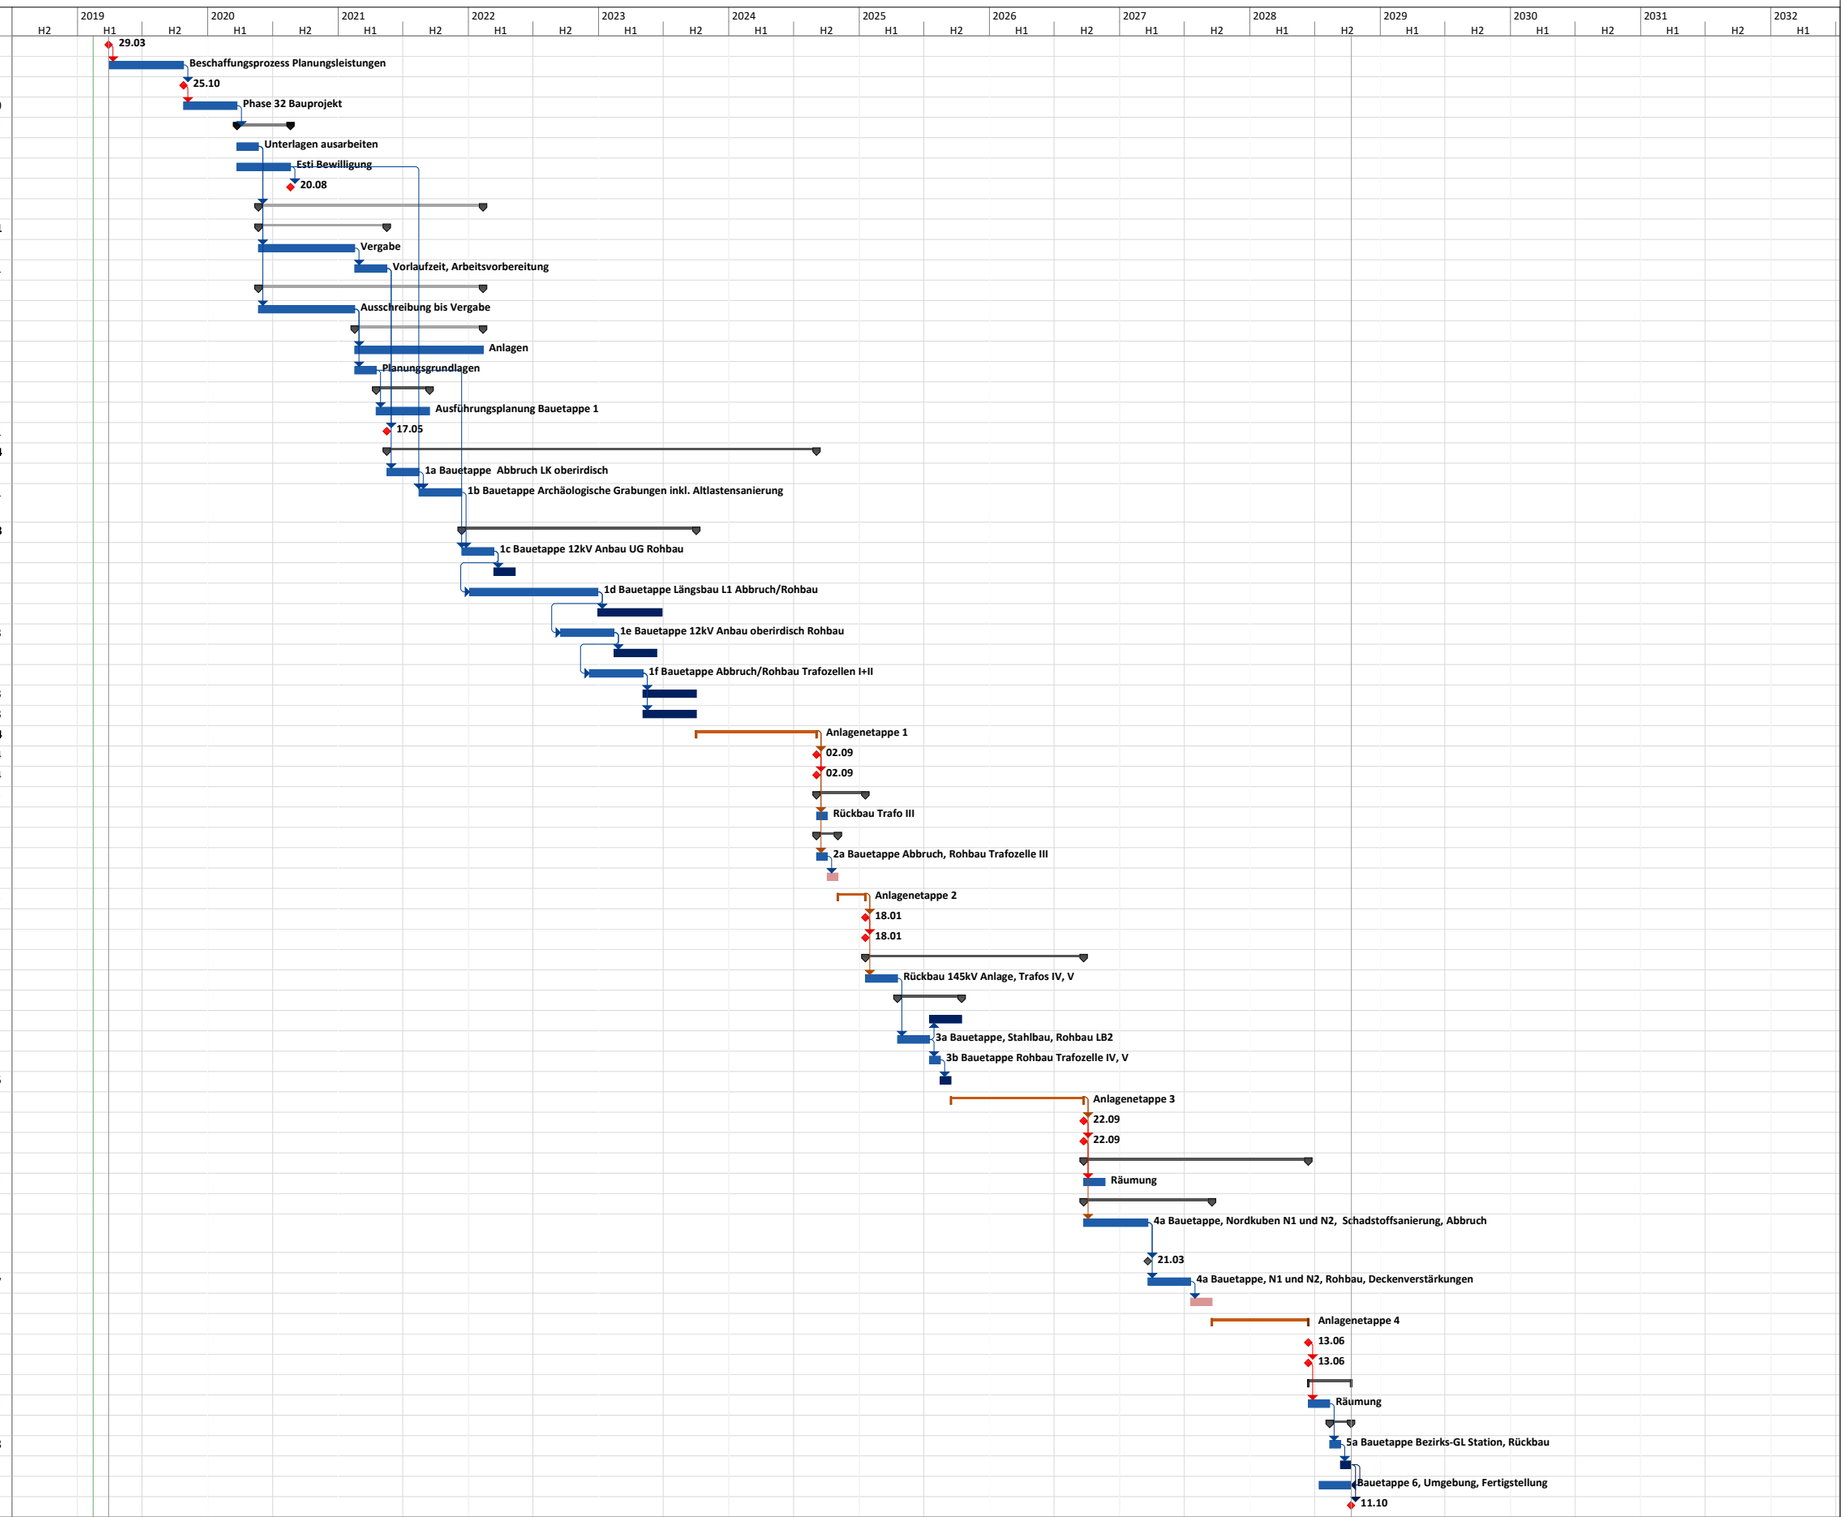

Projekt: Projekt1
Datum: Don 14.02.19

Vorgang | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Externer Meilenstein | Inaktiver Meilenstein | Manueller Vorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Anfang | Stichtag | Manueller Fortschritt
Unterbrechung | Sammelvorgang | Externe Vorgänge | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Ende | In Arbeit
