N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1		**GRANDS ESSERTS - PLANNING INTENTIONNEL**	**4272 jours**	**Mer 17.04.19**	**Jeu 30.08.35**
2		**1- AVANCEMENT DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES**	**1573 jours**	**Mer 17.04.19**	**Ven 25.04.25**
3		Scénario réaliste	1573 jours	Mer 17.04.19	Ven 25.04.25
4		**PLQ n° 29'983 ("Maison de Vessy") CPEG**	**147 jours**	**Lun 12.04.21**	**Mar 02.11.21**
5		**Demande d'autorisation DD 113'299**	**98 jours**	**Lun 12.04.21**	**Mer 25.08.21**
9		Traitement recours	49 jours	Jeu 26.08.21	Mar 02.11.21
10		Levée de l'effet suspensif	0 jour	Mar 02.11.21	Mar 02.11.21
11		Autorisation en force	0 jour	Mar 02.11.21	Mar 02.11.21
12		**PLQ n° 30'008 ("Ferme") FIVV**	**1054 jours**	**Mer 17.04.19**	**Lun 01.05.23**
13		**Phase de formalisation et d'adoption du PLQ**	**564 jours**	**Mer 17.04.19**	**Lun 14.06.21**
16		**Demande d'autorisation DD 112'992**	**156 jours**	**Lun 10.05.21**	**Lun 13.12.21**
17		Procédure de demande d'autorisation de construire et synthèse	125 jours	Lun 10.05.21	Ven 29.10.21
18		Publication FAO	1 jour	Lun 01.11.21	Lun 01.11.21
19		Délai de recours	30 jours	Mar 02.11.21	Lun 13.12.21
20		Traitement recours	360 jours	Mar 14.12.21	Lun 01.05.23
21		Levée de l'effet suspensif	0 jour	Lun 11.07.22	Lun 11.07.22
22		Autorisation en force (au plus tôt)	0 jour	Lun 01.05.23	Lun 01.05.23
23		**PLQ n° 30'038 ("Beaux-Champs")**	**1369 jours**	**Mer 17.04.19**	**Lun 15.07.24**
24		**Phase de formalisation et d'adoption du PLQ**	**744 jours**	**Mer 17.04.19**	**Lun 21.02.22**
28		**Demande d'autorisation**	**491 jours**	**Lun 12.04.21**	**Lun 27.02.23**
29		Procédure de demande d'autorisation: préparation, dépose et instruction	460 jours	Lun 12.04.21	Ven 13.01.23
30		Publication FAO	1 jour	Lun 16.01.23	Lun 16.01.23
31		Délai de recours	30 jours	Mar 17.01.23	Lun 27.02.23
32		Traitement recours	360 jours	Mar 28.02.23	Lun 15.07.24
33		Autorisation en force (au plus tôt)	0 jour	Lun 15.07.24	Lun 15.07.24
34		**Mesures Routières: DD 113'357 Route de Veyrier**	**211 jours**	**Lun 12.04.21**	**Lun 31.01.22**
38		Traitement du recours	360 jours	Mar 01.02.22	Lun 19.06.23
39		Autorisation en force (au plus tôt)	0 jour	Lun 19.06.23	Lun 19.06.23
40		**Mesures Routières: DD 113'356 Route de Vessy**	**67 jours**	**Lun 12.04.21**	**Mar 13.07.21**
44		Traitement du recours	360 jours	Mer 14.07.21	Mar 29.11.22
45		Réponse OCT - Levée de l'effet suspensif	0 jour	Mar 08.03.22	Mar 08.03.22
46		Autorisation en force (au plus tôt)	0 jour	Mar 29.11.22	Mar 29.11.22
47		**DD Projet Espaces Publics**	**670 jours**	**Lun 03.10.22**	**Ven 25.04.25**
48		Mise à jour du projet EP en vue d'une dépose de DD (Etape 1 et 2)	0 jour	Lun 03.10.22	Lun 03.10.22
49		Délibération et votation du crédit de Réalisation des Espaces Publics (etape 1 ET 2)	80 jours	Lun 03.10.22	Ven 20.01.23
50		Procédure de demande d'autorisation: dépose et instruction (étape 1 ET 2)	240 jours	Lun 03.10.22	Ven 01.09.23
51		Publication de l'autorisation de construction (étape 1 ET 2)	70 jours	Lun 04.09.23	Ven 08.12.23
52		Délai de recours + traitement recours	360 jours	Lun 11.12.23	Ven 25.04.25
53		Autorisation en force (au plus tôt)	0 jour	Ven 25.04.25	Ven 25.04.25
54		**PLQ n° 30'082 ("Cirses")**	**861 jours**	**Lun 12.04.21**	**Lun 29.07.24**
55		**Phase de formalisation et d'adoption du PLQ**	**305 jours**	**Lun 12.04.21**	**Ven 10.06.22**
56		Préavis CM	0 jour	Lun 12.04.21	Lun 12.04.21
57		Délai référemdum	16 jours	Lun 12.04.21	Lun 03.05.21
58		Organisation et résultat du processus référendaire	40 jours	Mar 04.05.21	Lun 28.06.21
59		Décision votation publique	0 jour	Lun 29.11.21	Lun 29.11.21
60		Décision du Conseil d'Etat	60 jours	Lun 29.11.21	Ven 18.02.22
61		Arrêté d'adoption et démarrage du processus d'opposition	80 jours	Lun 21.02.22	Ven 10.06.22
62		**DD Projet Ecole des Circes**	**861 jours**	**Lun 12.04.21**	**Lun 29.07.24**
63		Rendu du concours	201 jours	Lun 12.04.21	Lun 17.01.22
64		Attribution et prise en main du dossier	80 jours	Mar 18.01.22	Lun 09.05.22
65		Introduction du projet de délibération - crédit d'études	20 jours	Mar 10.05.22	Lun 06.06.22
66		Votation du crédit d'études	60 jours	Mar 07.06.22	Lun 29.08.22
67		Etablissement du projet en vue d'une dépose de DD	160 jours	Mar 30.08.22	Lun 10.04.23
68		Procédure de demande d'autorisation: dépose et instruction	240 jours	Mar 11.04.23	Lun 11.03.24
69		Introduction du projet de délibération - crédit de réalisation	20 jours	Mar 11.04.23	Lun 08.05.23
70		Votation du crédit de Réalisation	60 jours	Mar 09.05.23	Lun 31.07.23
71		Publication de l'autorisation de construction	70 jours	Mar 12.03.24	Lun 17.06.24
72		Délai de recours	30 jours	Mar 18.06.24	Lun 29.07.24
73		Autorisation en force (au plus tôt)	0 jour	Lun 29.07.24	Lun 29.07.24
74		**2- COORDINATION INTER-MO : GOUVERNANCE DE PROJET**	**375 jours**	**Lun 12.04.21**	**Ven 16.09.22**
75		Convention de réalisation des Espaces Publics et de remodelage	295 jours	Lun 12.04.21	Ven 27.05.22
76		Gestion foncière	10 jours	Lun 26.04.21	Ven 07.05.21
79		Affinage de l'assiette d'Espaces Publics et de la temporalité des cessions	60 jours	Lun 10.05.21	Ven 30.07.21
80		Mise à jour du projet de remodelage	40 jours	Lun 12.04.21	Ven 04.06.21
83		Obtention du projet de remodelage ETAPE 1	90 jours	Lun 07.06.21	Ven 08.10.21
84		Définition et mise à jour du projet d'aménagement des Espaces Publics	100 jours	Lun 18.10.21	Ven 04.03.22
85		AO mandat architecte paysagiste	80 jours	Lun 18.10.21	Ven 04.02.22
86		*Activation du mandat*	*20 jours*	*Lun 07.02.22*	*Ven 04.03.22*
87		Mise à jour du projet EP	60 jours	Lun 07.03.22	Ven 27.05.22
88		**Choix décisionnels inter-MO**	**335 jours**	**Ven 04.06.21**	**Ven 16.09.22**
92		**Conventions**	**335 jours**	**Lun 07.06.21**	**Ven 16.09.22**
96		**3- LANCEMENT PHASE REALISATION - ETAPE 1**	**3524 jours**	**Lun 28.02.22**	**Jeu 30.08.35**
97		**Réalisation ACTE 1**	**1005 jours**	**Lun 28.02.22**	**Ven 02.01.26**
98		Travaux préliminaires Maison de Vessy	97 jours	Lun 28.02.22	Mar 12.07.22
99		Projet remodelage	180 jours	Mar 12.07.22	Lun 20.03.23
100		Projet Espaces Publics - Acte 1	180 jours	Lun 28.04.25	Ven 02.01.26
101		**Date de libération de l'emprise JP par chantier MdV**	**0 jour**	**Lun 31.03.25**	**Lun 31.03.25**
102		Projets des PU	720 jours	Mar 21.03.23	Lun 22.12.25
103		Projets des mesures routières	240 jours	Mar 20.06.23	Lun 20.05.24
104		**Entrée en service du quartier: déménagements**	**120 jours**	**Mar 23.12.25**	**Lun 08.06.26**
105		**Réalisation ACTE 2 (Bx-Champs et Ecole des Cirses)**	**640 jours**	**Mar 16.07.24**	**Lun 28.12.26**
106		Pièce urbaine Beaux-Champs	640 jours	Mar 16.07.24	Lun 28.12.26
107		Date de libération de l'emprise JP par chantier Bx-Champs	0 jour	Mar 21.04.26	Mar 21.04.26
108		Projet Espaces Publics - Acte 1	180 jours	Mar 21.04.26	Lun 28.12.26
109		Projets école des Circes	545 jours	Mar 30.07.24	Lun 31.08.26
110		**Entrée en service Acte 2: déménagements**	**120 jours**	**Mar 29.12.26**	**Lun 14.06.27**
111		**Finalisation du quartier Etape 1: premiers habitants + école**	**0 jour**	**Ven 27.08.27**	**Ven 27.08.27**
112		**4- LANCEMENT PHASE REALISATION - ETAPE 2**	**2519 jours**	**Lun 05.01.26**	**Jeu 30.08.35**
113		**Réalisation ACTE 3 (Salève, Nant 1, Lisière)**	**780 jours**	**Lun 05.01.26**	**Ven 29.12.28**
114		**Date de libération de l'emprise JP par chantier MdV**	**0 jour**	**Lun 17.08.26**	**Lun 17.08.26**
115		Projet remodelage	180 jours	Lun 05.01.26	Ven 11.09.26
116		Projet Espaces Publics - Acte 3	240 jours	Lun 14.09.26	Ven 13.08.27
117		Projets des PU	600 jours	Lun 14.09.26	Ven 29.12.28
118		**Entrée en service du quartier: déménagements**	**120 jours**	**Lun 01.01.29**	**Ven 15.06.29**
119		**Réalisation ACTE 4 (Nant 2, Arve)**	**1205 jours**	**Lun 20.05.30**	**Ven 29.12.34**
120		Pièce urbaine	1205 jours	Lun 20.05.30	Ven 29.12.34
121		Date de libération des emprises sur EP	0 jour	Lun 24.04.34	Lun 24.04.34
122		Projet Espaces Publics - Acte 4	180 jours	Lun 24.04.34	Ven 29.12.34
123		**Entrée en service Acte 4: déménagements**	**120 jours**	**Lun 01.01.35**	**Ven 15.06.35**
124		**Finalisation du quartier Etapes 1 ET 2**	**0 jour**	**Jeu 30.08.35**	**Jeu 30.08.35**

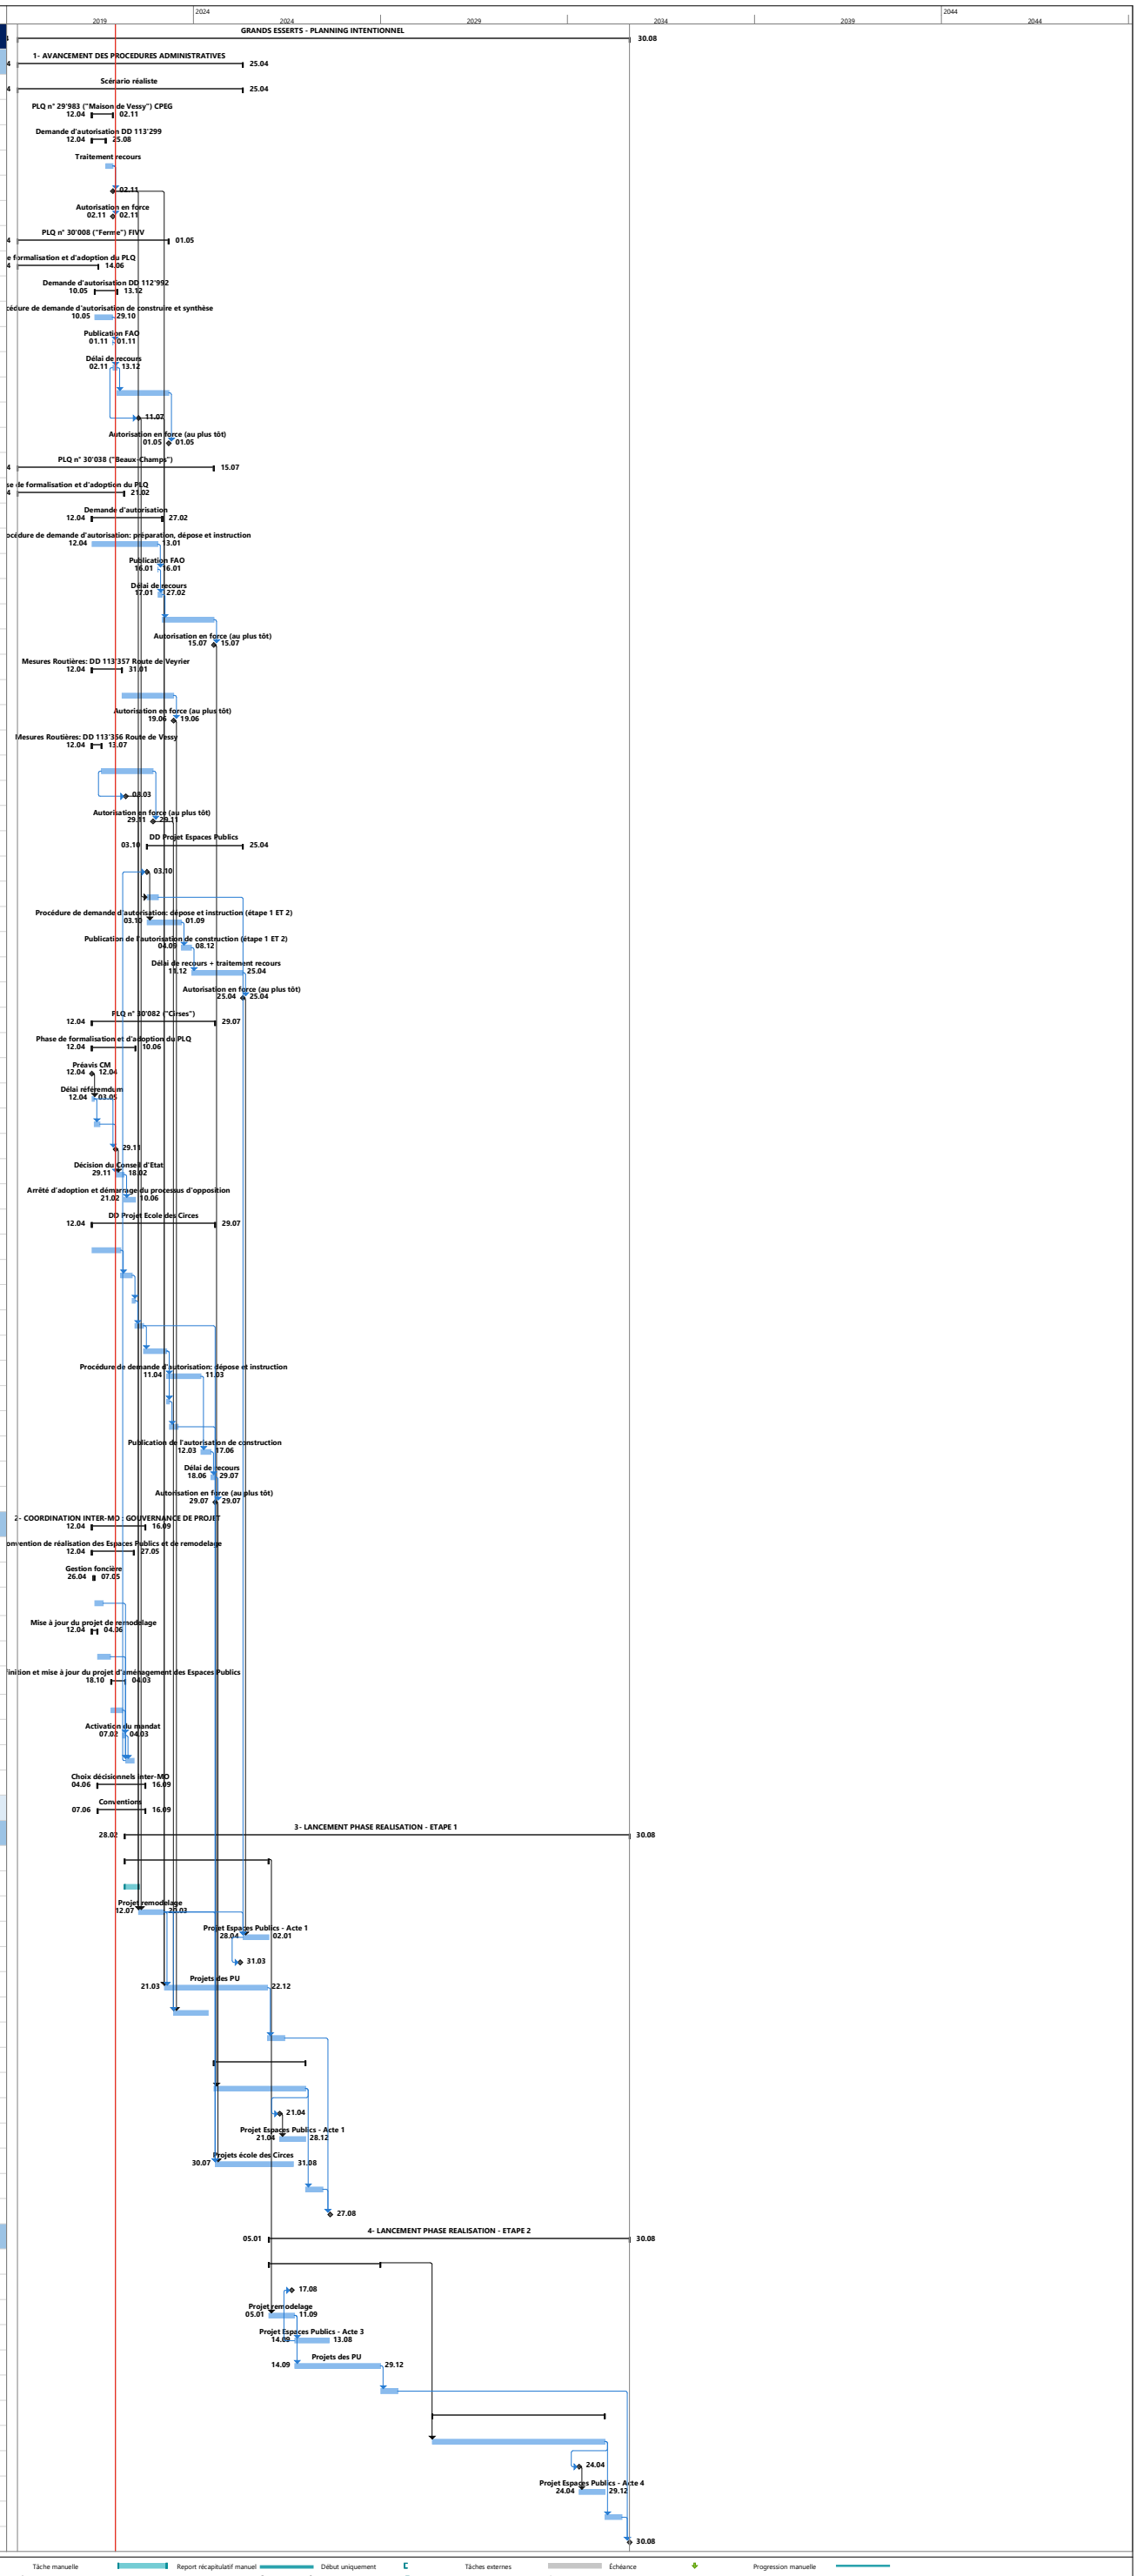

Projet : 211121 GE Planning int
Date : Lun 29.11.21

Tâche · Fractionnement · Jalon · Récapitulative · Récapitulatif du projet · Tâche inactive · Jalon inactif · Récapitulatif inactif · Tâche manuelle · Durée uniquement · Report récapitulatif manuel · Récapitulatif manuel · Début uniquement · Fin uniquement · Tâches externes · Jalons externes · Échéance · Avancement · Progression manuelle
