AIB Basel-Landschaft: Terminplan MWB Chaibacher in Böckten, 21.7.2020, Rapp Infra AG

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorg.
1	**Gesamtprojekt MWB**	**262.5 Tage**	**Mo 04.01.21**	**Mi 05.01.22**	
2	A: Baustelleneinrichtung	1 Woche	Mo 04.01.21	Fr 08.01.21	
3	B: Erstellung Querung WAS DN1200 unter Ergolz	4 Wochen	Mo 11.01.21	Fr 05.02.21	2
4	**C: Beginn Bauarbeiten MWB (Baumeisterarbeiten)**	**97.5 Tage**	**Mo 08.02.21**	**Mi 23.06.21**	
5	Baugrubenaushub und -verbau	4 Wochen	Mo 08.02.21	Fr 05.03.21	3
6	Grundwasserhaltung einrichten	0.5 Wochen	Mo 08.03.21	Mi 10.03.21	5
7	Sauberkeitsschicht, Bodenplatte, Pumpensumpf erstellen	1 Woche	Mi 10.03.21	Mi 17.03.21	6
8	Aussen-, Innenwände, Treppen erstellen	6 Wochen	Mi 17.03.21	Mi 28.04.21	7
9	Decke Schalen, Bewehren, Betonieren	4 Wochen	Mi 28.04.21	Mi 26.05.21	8
10	Aussteifungsriegel Schalen, Bewehren, Betonieren	2 Wochen	Mi 26.05.21	Mi 09.06.21	9
11	Baugrube verfüllen und Spundung entfernen	2 Wochen	Mi 09.06.21	Mi 23.06.21	10
12	D: Erstellung Leitung Schmutzwasser DN1200 von Querung Ergolz bis vor Spundwand	20 Tage	Mo 08.02.21	Fr 05.03.21	3
13	E: Erstellung Auslaufbauwerk in Ergolz	1 Woche	Mo 08.03.21	Fr 12.03.21	12
14	F: Erstellung Sauberwasser- und Entlastungsleitung DN1200 (Nach Abschluss kann Platz als Lagerfläche genutzt werden)	4 Wochen	Mo 15.03.21	Fr 09.04.21	13
15	G: Beginn Bauarbeiten Trennbauwerk Süd	4 Wochen	Mo 12.04.21	Fr 07.05.21	14
16	H: Beginn Bauarbeiten Trennbauwerk Nord	5 Wochen	Mo 10.05.21	Fr 11.06.21	15
17	I: Erstellung WAS DN400 südl. von Sissacherstrasse bis Trennbauwerk Nord	1 Woche	Mo 14.06.21	Fr 18.06.21	16
18	J: Fertigstellung MWB	0 Wochen	Mi 23.06.21	Mi 23.06.21	11
19	K: Erstellen Anschluss Längenprofil 3 mit DN1000 an MWB	1 Woche	Mi 23.06.21	Mi 30.06.21	18
20	L: Erstellung Sauberwasserleitung DN1000	2 Wochen	Mi 30.06.21	Mi 14.07.21	19
21	M: Beginn Bauarbeiten Vereinigungsschacht	5 Wochen	Mi 30.06.21	Mi 04.08.21	19
22	N: Erstellen Anschluss Längenprofil 4 DN1200 an MWB	1 Woche	Mi 30.06.21	Mi 07.07.21	19
23	O: Erstellen Druckleitung/Entleerung DN250 und DN160	1 Woche	Mi 14.07.21	Mi 21.07.21	20
24	P: Erstellen unterirdische und oberirdische Aufbauten	3 Wochen	Mi 23.06.21	Mi 14.07.21	18
25	Q: Ausrüstung MWB (Schieber, Pumpen, Rührwerke, Lüftung, Steuerung usw.)	6 Wochen	Mi 23.06.21	Mi 04.08.21	18
26	**Gelände Messag AG: Arbeiten grösstenteils abgeschlossen**	**0 Tage**	**Mi 04.08.21**	**Mi 04.08.21**	**25**
27	**Baumassnahmen im Bereich Sissacherstrasse Teil 1**	**25 Tage**	**Mi 21.07.21**	**Mi 25.08.21**	
28	R: Querung Sissacherstrasse Sauberwasserleitung DN400	2 Wochen	Mi 21.07.21	Mi 04.08.21	23
29	S: Querung Sissacherstrasse Sauberwasserleitung DN1000	3 Wochen	Mi 04.08.21	Mi 25.08.21	28
30	T: Umbau 24KRA 0A 145 und 24KKS 0A 149 (Schieber in 24 KRA 0A 145 geschlossen)	3 Wochen	Mi 25.08.21	Mi 15.09.21	29
31	U: Fertigstellung Trennbauwerk Süd und Nord	0 Tage	Mi 15.09.21	Mi 15.09.21	30
32	V: MWB muss betriebsbereit sein, provisorischer Wasserlauf östlich Ergolz über MWB in HSK Sissacherstrasse	0 Tage	Mi 15.09.21	Mi 15.09.21	30
33	**W: Baumassnahmen im Bereich Sissacherstrasse Teil 2**	**60 Tage**	**Mi 15.09.21**	**Mi 08.12.21**	
34	Einrichten Ampelbetrieb, Strassenbaustelle	0.5 Wochen	Mi 15.09.21	Fr 17.09.21	32
35	WAR Kanal zwischen 12 KKS 0A 155/24KRA 0A 153 abbrechen	1 Woche	Mo 20.09.21	Fr 24.09.21	34
36	Provisorische Wasserhaltung WAS einrichten	0.5 Wochen	Mo 27.09.21	Mi 29.09.21	35
37	GUP DN1100 in best. WAS Kanal einlegung und einbetonieren zwischen 12 KKS 0A 155/24KRA 0A 153	2 Wochen	Mi 29.09.21	Mi 13.10.21	36
38	neue WAS GUP DN 1100 erstellen und einbetonieren zwischen 24KRA 0A 153/Trennbauwerk Nord	2 Wochen	Mi 13.10.21	Mi 27.10.21	37
39	X: Umbau Bestehender Schacht 24 KRA 0A 153	6 Wochen	Mi 27.10.21	Mi 08.12.21	38
40	Y: Schieber in Schacht 24 KRA 0A 145 öffnen (Becken in Betrieb)	0 Tage	Mi 08.12.21	Mi 08.12.21	39
41	Z: Telekom- und Wasseranschlüsse erstellen	2 Wochen	Mi 08.12.21	Mi 22.12.21	40
42	AA: Instandsetzung Umgebung, Randabschlüsse, Belagsarbeiten	4 Wochen	Mi 08.12.21	Mi 05.01.22	40
43	BB: Bauende	0 Tage	Mi 05.01.22	Mi 05.01.22	42

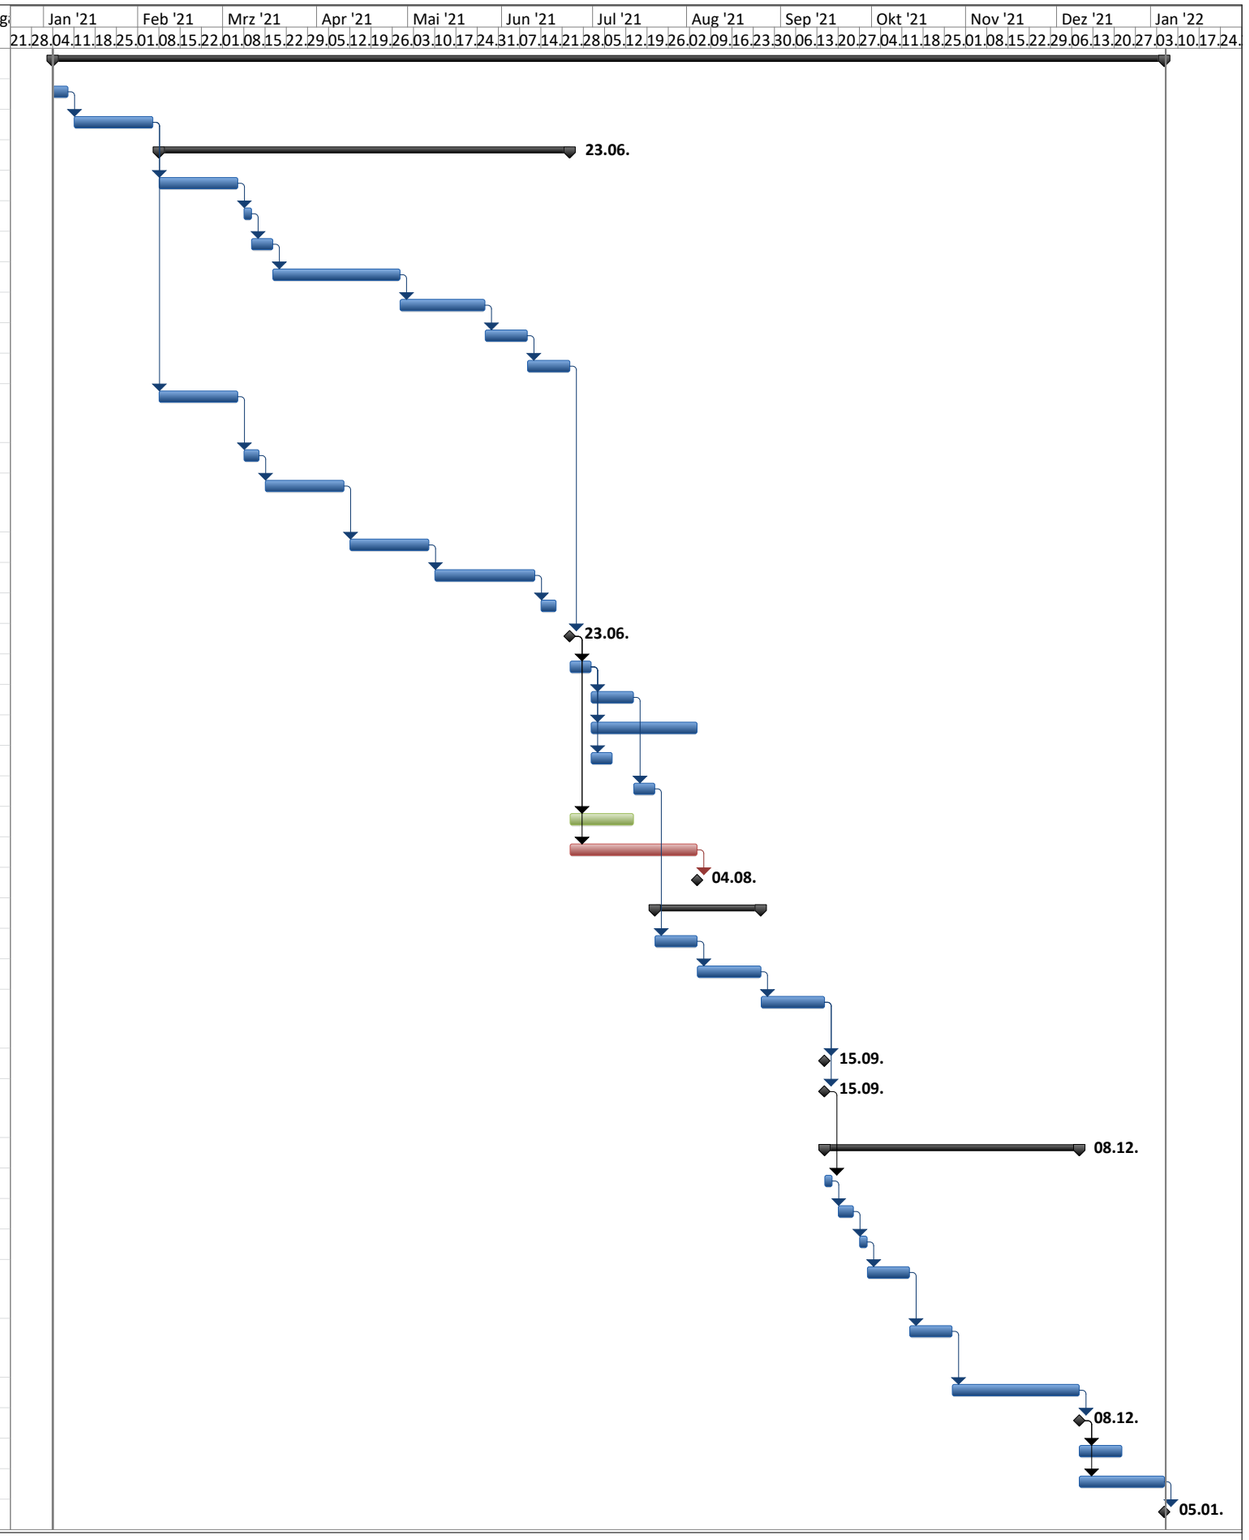

Projekt: 20200721_Terminplan_M
Datum: Di 21.07.20

Vorgang	Sammelvorgang	Externer Meilenstein	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelrollup	Nur Ende
Unterbrechung	Projektsammelvorgang	Inaktiver Vorgang	Manueller Vorgang	Manueller Sammelvorgang	Stichtag
Meilenstein	Externe Vorgänge	Inaktiver Meilenstein	Nur Dauer	Nur Anfang	In Arbeit
