Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt

Beilage 4

Rahmenterminprogramm
Knoten Dürntner-/Wändhüslenstrasse
Bubikon
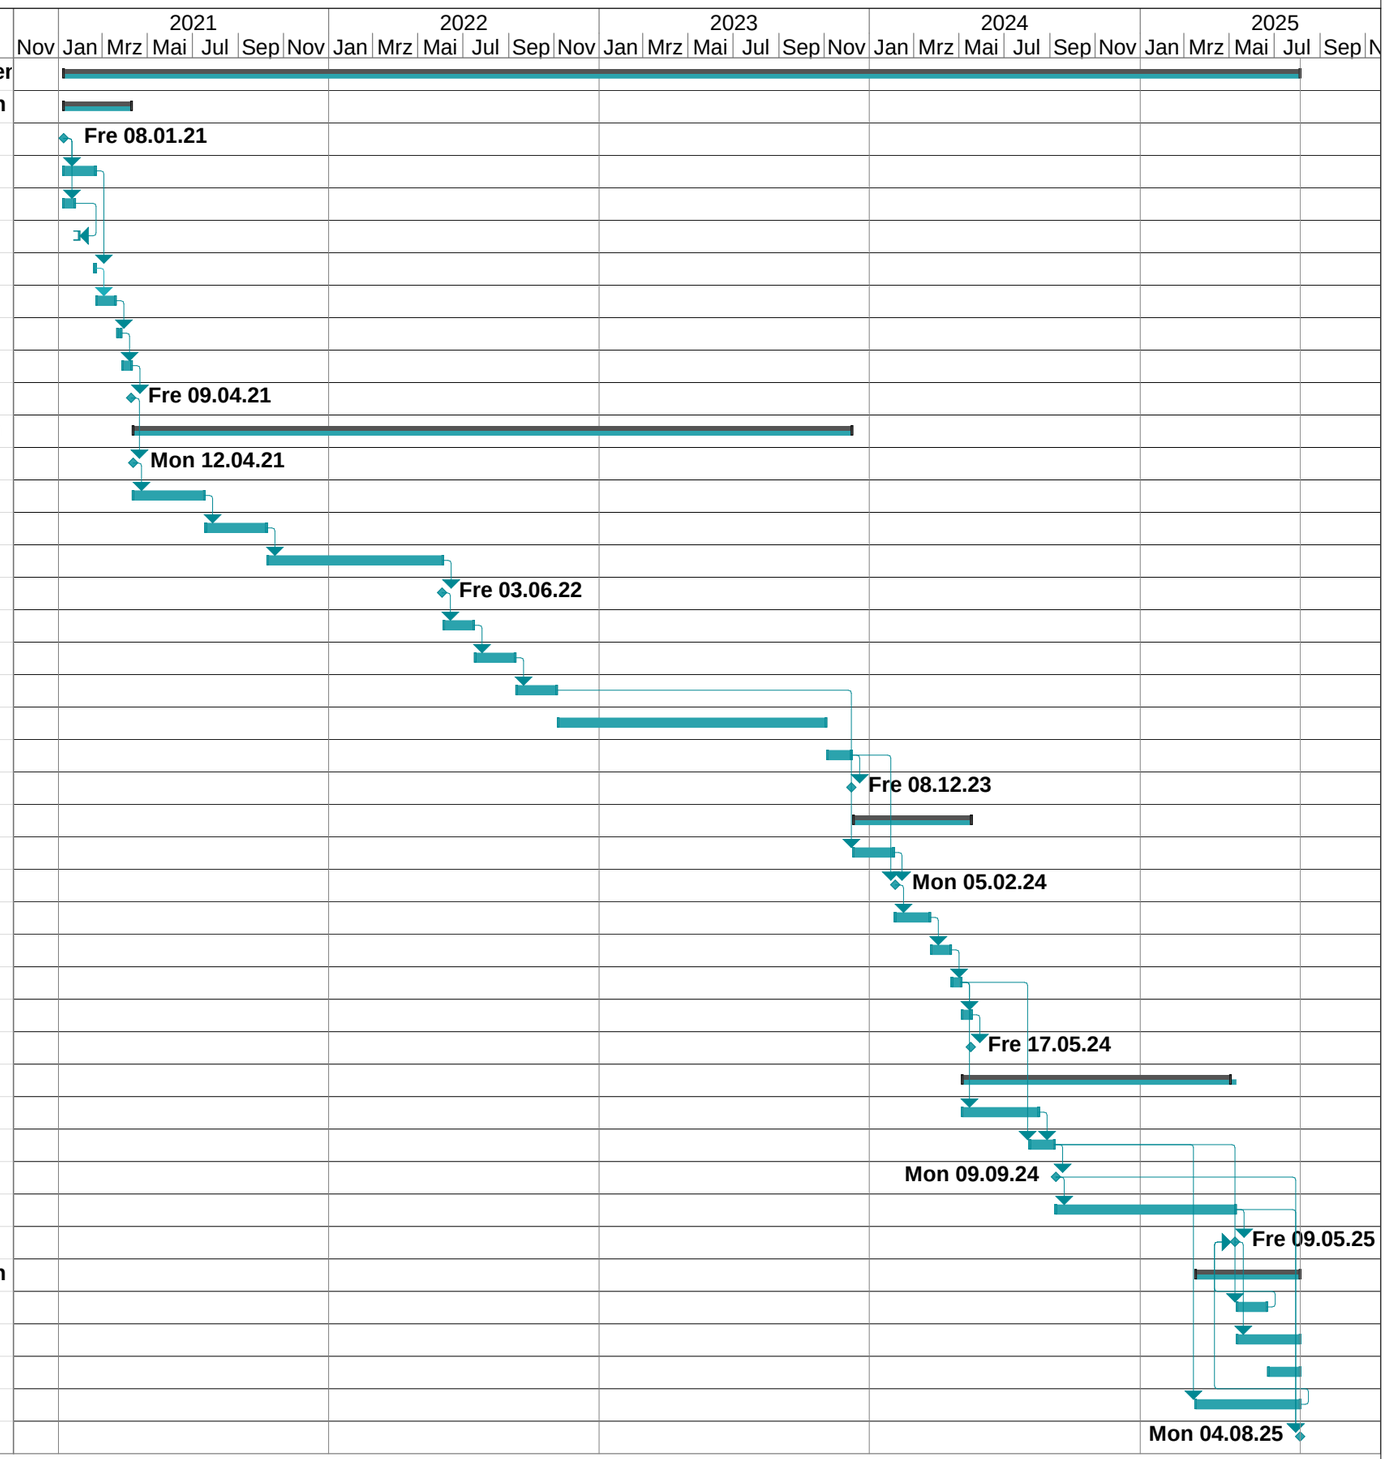
Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Dauer
1	**Neubau Kreisel und Anschluss Recyclinghof**	**Fre 08.01.21**	**Mon 04.08.25**	**238.4 Wochen**
2	**Ingenieursplanersubmissionen**	**Fre 08.01.21**	**Fre 09.04.21**	**13.2 Wochen**
3	***Publikation***	***Fre 08.01.21***	***Fre 08.01.21***	***0 Wochen***
4	Angebotserarbeitung	Fre 08.01.21	Fre 19.02.21	6.2 Wochen
5	***Eingabefrist Fragen***	***Fre 08.01.21***	***Fre 22.01.21***	***2.2 Wochen***
6	Beantwortung Fragen bis		Fre 29.01.21	
7	***Abgabe Angebote***	***Fre 19.02.21***	***Fre 19.02.21***	***0.2 Wochen***
8	Vergabeantrag durch BHU	Mon 22.02.21	Don 18.03.21	3.8 Wochen
9	Vergabe, Zu-/Absageschreibe	Mon 22.03.21	Fre 26.03.21	1 Woche
10	Rekursfrist, Planervertrag	Mon 29.03.21	Fre 09.04.21	2 Wochen
11	***Phasenabschluss***	***Fre 09.04.21***	***Fre 09.04.21***	***0 Wochen***
12	**Projektierung**	**Mon 12.04.21**	**Fre 08.12.23**	**139 Wochen**
13	***Startsitzung Ingenieurplaner***	***Mon 12.04.21***	***Mon 12.04.21***	***0 Wochen***
14	Vorprojekt	Mon 12.04.21	Fre 16.07.21	14 Wochen
15	Begehrensäusserung §12/ Mitwirkung §13	Mon 19.07.21	Fre 08.10.21	12 Wochen
16	Bauprojekt	Mon 11.10.21	Fre 03.06.22	34 Wochen
17	***Abgabe Bauprojekt***	***Fre 03.06.22***	***Fre 03.06.22***	***0 Wochen***
18	Planauflage §16/17 StrG	Mon 06.06.22	Fre 15.07.22	6 Wochen
19	Behandlung allfälliger Einsprachen	Mon 18.07.22	Fre 09.09.22	8 Wochen
20	Überarbeitung Bauprojekt aufgrund Einsprachen	Mon 12.09.22	Fre 04.11.22	8 Wochen
21	Festsetzung Projekt §15 StrG und Krediterteilung	Mon 07.11.22	Fre 03.11.23	52 Wochen
22	Rechtskraftbescheinigung Festsetzung Projekt	Mon 06.11.23	Don 07.12.23	4.8 Wochen
23	***Phasenabschluss***	***Fre 08.12.23***	***Fre 08.12.23***	***0 Wochen***
24	**Ausschreibung**	**Mon 11.12.23**	**Fre 17.05.24**	**23 Wochen**
25	Erstellung Ausschreibungsunterlagen	Mon 11.12.23	Fre 02.02.24	8 Wochen
26	***Publikation***	***Mon 05.02.24***	***Mon 05.02.24***	***0 Wochen***
27	Angebotserarbeitung Unternehmer	Mon 05.02.24	Fre 22.03.24	7 Wochen
28	Offertvergleich und Vergabeantrag	Mon 25.03.24	Fre 19.04.24	4 Wochen
29	Vergabe	Mon 22.04.24	Fre 03.05.24	2 Wochen
30	Rekursfrist, Werkvertrag	Mon 06.05.24	Fre 17.05.24	2 Wochen
31	***Phasenabschluss***	***Fre 17.05.24***	***Fre 17.05.24***	***0 Wochen***
32	**Realisierung**	**Mon 06.05.24**	**Fre 02.05.25**	**52 Wochen**
33	Ausführungsprojekt	Mon 06.05.24	Fre 16.08.24	15 Wochen
34	AVOR Unternehmer	Mon 05.08.24	Fre 06.09.24	5 Wochen
35	***Baubeginn***	***Mon 09.09.24***	***Mon 09.09.24***	***0 Wochen***
36	Bau / Bauleitung	Mon 09.09.24	Fre 09.05.25	35 Wochen
37	***Bauende***	***Fre 09.05.25***	***Fre 09.05.25***	***0 Wochen***
38	**Abschluss**	**Mon 17.03.25**	**Mon 04.08.25**	**20.2 Wochen**
39	Inbetriebnahme, Abnahme	Mon 12.05.25	Fre 20.06.25	6 Wochen
40	Abrechnung, Abgabe PAW	Mon 12.05.25	Mon 04.08.25	12.2 Wochen
41	Projektabrechnung	Mon 23.06.25	Mon 04.08.25	6.2 Wochen
42	Vollzug Landerwerb, Mutationen	Mon 17.03.25	Mon 04.08.25	20.2 Wochen
43	***Phasenabschluss***	***Mon 04.08.25***	***Mon 04.08.25***	***0.2 Wochen***
