A2.3 VALUTAZIONE DEL PIANO D'IMPEGNO PER FUNZIONE SULL'ARCO TEMPORALE DEL CANTIERE

Anno	2019											
Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Durata (mesi)							1	2	3	4	5	6
Durata cantiere (mesi)												
Fase 41: EP-Manutenzione							←					
Fase 52 UeMa MGG												
Fase 51-52-53: EP-Manutenzione							←					
Resp. DTL/DLL							20%	20%	20%	20%	20%	20%
Sost. Resp. DTL/DLL							20%	20%	20%	20%	20%	20%
Resp. AAL									10%	10%	10%	10%
Assist. DL							5%	5%	20%	20%	20%	20%
Ing. GC/BSA							50%	50%	50%	120%	120%	120%
Tecnici/Disegnatori							0%	40%	40%	40%	40%	40%
Amministrazione di cantiere							0%	0%	0%	0%	0%	0%
Apprendista							0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totale per mese							95%	135%	160%	230%	230%	230%

Anno	2020											
Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Durata (mesi)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Durata cantiere (mesi)			1	2	3	4			5	6	7	
Fase 41: EP-Manutenzione	←											
Fase 52 UeMa MGG												
Fase 51-52-53: EP-Manutenzione	←											
Resp. DTL/DLL	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Sost. Resp. DTL/DLL	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Resp. AAL	10%	10%	30%	30%	30%	30%	10%	10%	30%	30%	30%	10%
Assist. DL	20%	20%	200%	200%	200%	200%	50%	50%	200%	200%	200%	50%
Ing. GC/BSA	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%
Tecnici/Disegnatori	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Amministrazione di cantiere	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%
Apprendista	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	10%	10%
Totale per mese	330%	330%	530%	530%	530%	530%	360%	360%	560%	560%	560%	390%

Anno	2021											
Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Durata (mesi)	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Durata cantiere (mesi)		8	9	10	11	12			13	14	15	
Fase 41: EP-Manutenzione												
Fase 52 UeMa MGG												
Fase 51-52-53: EP-Manutenzione												
Resp. DTL/DLL	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Sost. Resp. DTL/DLL	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Resp. AAL	10%	30%	30%	30%	30%	30%	10%	10%	30%	30%	30%	10%
Assist. DL	50%	200%	200%	200%	200%	200%	50%	0%	200%	200%	200%	75%
Ing. GC/BSA	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	100%	120%	120%	120%	100%
Tecnici/Disegnatori	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%
Amministrazione di cantiere	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Apprendista	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	10%	10%	10%	10%
Totale per mese	410%	580%	580%	580%	580%	580%	410%	330%	580%	580%	580%	415%

Anno	2022											
Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Durata (mesi)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Durata cantiere (mesi)		16	17	18	19	20			21	22	23	
Fase 41: EP-Manutenzione												
Fase 52 UeMa MGG												
Fase 51-52-53: EP-Manutenzione												
Resp. DTL/DLL	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Sost. Resp. DTL/DLL	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Resp. AAL	10%	30%	30%	30%	30%	30%	10%	10%	30%	30%	30%	10%
Assist. DL	75%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	0%	200%	200%	200%	100%
Ing. GC/BSA	100%	120%	120%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	100%
Tecnici/Disegnatori	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	100%	100%	100%	100%
Amministrazione di cantiere	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Apprendista	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	10%	10%	10%	10%
Totale per mese	415%	580%	580%	560%	560%	560%	540%	310%	540%	540%	540%	420%
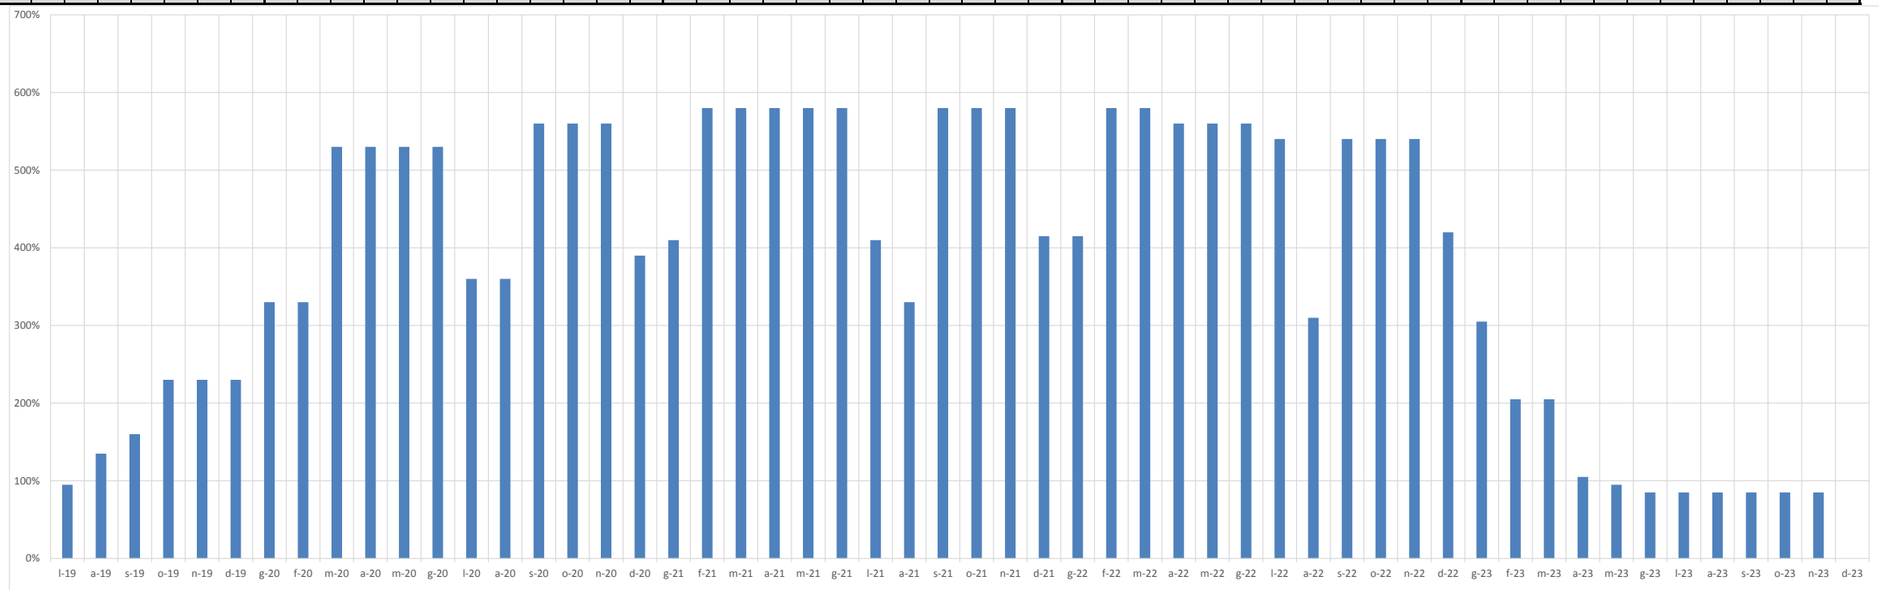
Anno	2023											
Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Durata (mesi)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	
Durata cantiere (mesi)												
Fase 41: EP-Manutenzione												
Fase 52 UeMa MGG												
Fase 51-52-53: EP-Manutenzione												
Resp. DTL/DLL	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Sost. Resp. DTL/DLL	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Resp. AAL	0%	0%										
Assist. DL	60%	60%	60%	60%	50%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
Ing. GC/BSA	100%	100%	100%									
Tecnici/Disegnatori	100%											
Amministrazione di cantiere	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
Apprendista												
Totale per mese	305%	205%	205%	105%	95%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	0%
