Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt

Rahmenterminprogramm
Memphisknoten und Fahrbahn Dübendorf

Beilage 6

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Dauer
1	**Memphisknoten und Fahrbahn Dübendorf**	**Fre 05.02.21**	**Fre 03.04.26**	**269.2 Wochen**
2	**Ingenieursplanersubmissionen**	**Fre 05.02.21**	**Die 04.05.21**	**12.6 Wochen**
3	***Publikation***	***Fre 05.02.21***	***Fre 05.02.21***	***0 Wochen***
4	Angebotserarbeitung	Fre 05.02.21	Fre 19.03.21	6.2 Wochen
5	***Eingabefrist Fragen***	***Fre 05.02.21***	***Fre 12.02.21***	***1.2 Wochen***
6	Beantwortung Fragen bis		Fre 19.02.21	
7	***Abgabe Angebote***	***Fre 19.03.21***	***Fre 19.03.21***	***0.2 Wochen***
8	Vergabeantrag durch BHU	Mon 22.03.21	Mit 14.04.21	3.6 Wochen
9	Vergabe, Zu-/Absageschreibe	Mon 12.04.21	Die 20.04.21	1.4 Wochen
10	Rekursfrist, Planervertrag	Die 20.04.21	Mon 03.05.21	2 Wochen
11	***Phasenabschluss***	***Die 04.05.21***	***Die 04.05.21***	***0 Wochen***
12	**Projektierung**	**Mit 05.05.21**	**Fre 17.05.24**	**158.6 Wochen**
13	***Startsitzung Ingenieurplaner***	***Mit 05.05.21***	***Mit 05.05.21***	***0 Wochen***
14	Vorprojekt	Mit 05.05.21	Fre 29.10.21	25.6 Wochen
15	Begehrensäusserung §12/ Mitwirkung §13	Mon 01.11.21	Fre 21.01.22	12 Wochen
16	Bauprojekt	Mon 24.01.22	Don 10.11.22	41.8 Wochen
17	***Abgabe Bauprojekt***	***Fre 11.11.22***	***Fre 11.11.22***	***0 Wochen***
18	Planauflage §16/17 StrG	Mon 14.11.22	Fre 23.12.22	6 Wochen
19	Behandlung allfälliger Einsprachen	Mon 02.01.23	Fre 24.02.23	8 Wochen
20	Überarbeitung Bauprojekt aufgrund Einsprachen	Mon 27.02.23	Fre 14.04.23	7 Wochen
21	Festsetzung Projekt §15 StrG und Krediterteilung	Mon 17.04.23	Fre 12.04.24	52 Wochen
22	Rechtskraftbescheinigung Festsetzung Projekt	Mon 15.04.24	Don 16.05.24	4.8 Wochen
23	***Phasenabschluss***	***Fre 17.05.24***	***Fre 17.05.24***	***0 Wochen***
24	**Ausschreibung**	**Mon 20.05.24**	**Fre 22.11.24**	**27 Wochen**
25	Erstellung Ausschreibungsunterlagen	Mon 20.05.24	Fre 26.07.24	10 Wochen
26	***Publikation***	***Mon 29.07.24***	***Mon 29.07.24***	***0 Wochen***
27	Angebotserarbeitung Unternehmer	Mon 29.07.24	Fre 20.09.24	8 Wochen
28	Offertvergleich und Vergabeantrag	Mon 23.09.24	Fre 18.10.24	4 Wochen
29	Vergabe	Mon 21.10.24	Don 07.11.24	2.8 Wochen
30	Rekursfrist, Werkvertrag	Fre 08.11.24	Don 21.11.24	2 Wochen
31	***Phasenabschluss***	***Fre 22.11.24***	***Fre 22.11.24***	***0 Wochen***
32	**Realisierung**	**Mon 11.11.24**	**Fre 05.12.25**	**56 Wochen**
33	Ausführungsprojekt	Mon 11.11.24	Fre 28.03.25	20 Wochen
34	AVOR Unternehmer	Mon 06.01.25	Fre 28.02.25	8 Wochen
35	***Baubeginn***	***Mon 03.03.25***	***Mon 03.03.25***	***0 Wochen***
36	Bau / Bauleitung	Mon 10.03.25	Fre 05.12.25	39 Wochen
37	***Bauende***	***Fre 05.12.25***	***Fre 05.12.25***	***0 Wochen***
38	**Abschluss**	**Mon 08.12.25**	**Fre 03.04.26**	**17 Wochen**
39	Abrechnung, PAW	Mon 08.12.25	Fre 13.02.26	10 Wochen
40	Projektabrechnung	Mon 09.02.26	Fre 03.04.26	8 Wochen
41	***Phasenabschluss***	***Fre 03.04.26***	***Fre 03.04.26***	***0 Wochen***

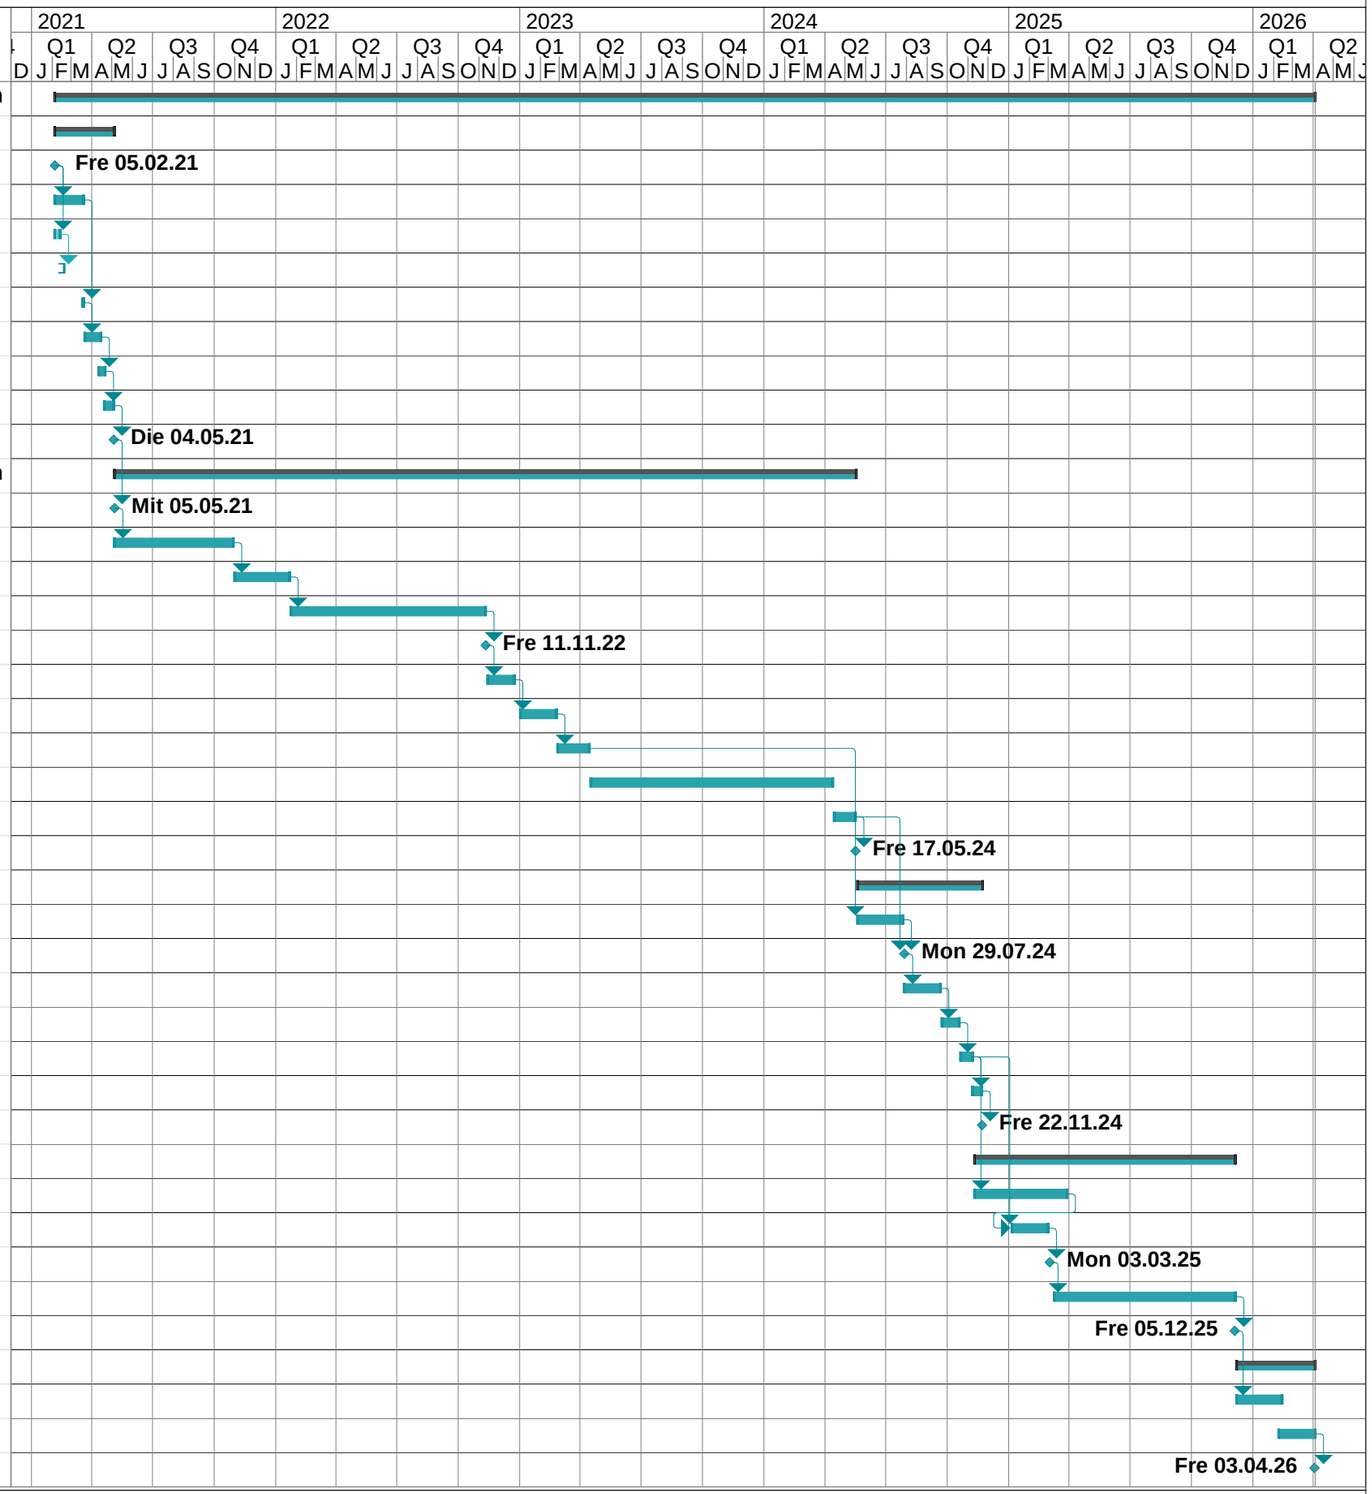

AFRY, mur

26.01.2021
