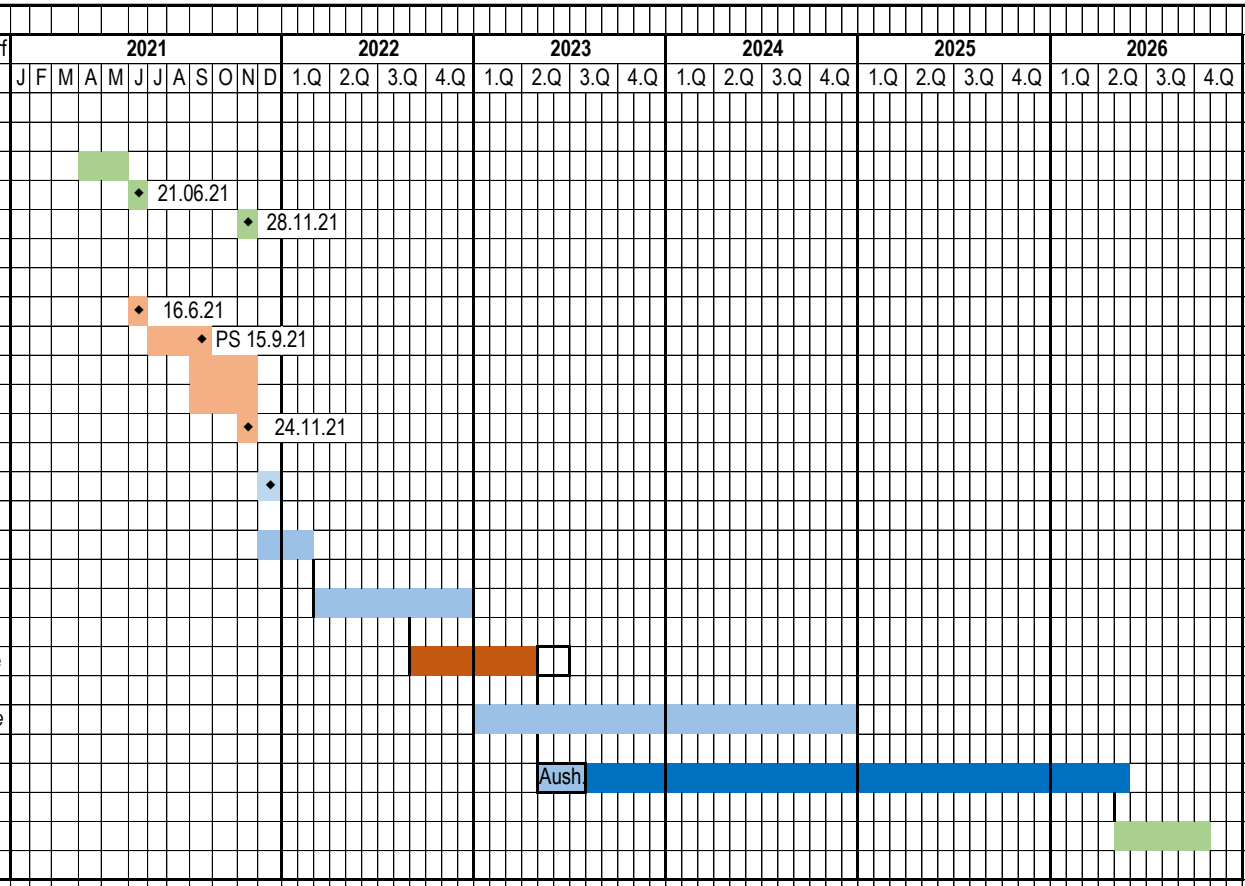Vorgang / Betreff	Verantw.	Zeitbedarf
Botschaft B69 vom 1.April 2021 / Volksbotschaft		
- INFO+Beratung vorberatende KR-Kommission (VBK)		
- KR - Beratung/Entscheid Juni-Session '21		
- Volksbotschaft / Volksabstimmung		
Vorphase Freigabe Realisierung (TU Stufe 2)		
- Aktualisierung Nutzergruppen	PS / OE	
- Aktualisierung Bestandesaufnahme OE	IMMO/OE	2-3 Mte
- Überarbeitung Geschosslayouts (Departemente; Ratio 1.4)	IMMO/TU	2-3 Mte
- Projektorganisation / Projekthandbuch Realisierung	IMMO/TU	2-3 Mte
- Abschluss / Genehmigung Vorphase	IMMO/PS	
Freigabe Realisierung TU Stufe 2 nach Volksabstimmung	IMMO	
Vorprojekt (Aktualisierung-Bereinigung)	LoMa	3 Mte
Bauprojekt - Baugesuch	LoMa	10 Mte
Baubewilligungsverfahren	LoMa	8-10 Mte
Ausführungsplanung / Ausschreibung	LoMa	*ca 20 Mte*
Baubeginn (Rohbau) **/ Bauausführung (T4 - T8)**	LoMa	34 Mte
Inbetriebnahme / Bezug in Etappen	IMMO	4-6 Mte
