

Gemeinde Schönenwerd

Strasse Oltner-/Aarauer-/Gösgerstrasse


Abschnitt / Objekt Einmündung Köllikerstrasse (Oltnerstr.) bis Stiftungskirche (Aarauerst.)
Knoten Oltner-/Aarauer-/Gösgerstrasse bis C.F. Ballystrasse (Gösgerstr.)

Projekt Sanierung Zentrumsdurchfahrt

Projektphase Ausschreibung Ingenieurleistungen

Inhalt **Dokument D**
Preisangebot

Übersicht

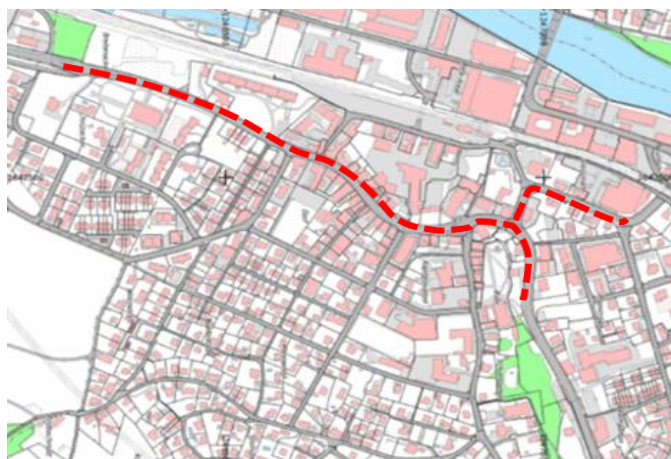

Eingabetermin **Freitag, 25. März 2022**

(Logo einfügen)

Anbieter
Strasse Nr.
PLZ Ort

Angebotssumme inkl. MwSt.

Fr. -

Unterschrift

Amt für Verkehr und Tiefbau
Rötihof, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn
Telefon 032 627 26 33
avt@bd.so.ch / avt.so.ch

Achs-Nr.	6100
Bezugspunkt (BP)	90 +90m bis 93 + 0 m
Achs-Nr.	5000
Bezugspunkt (BP)	556 + 165 m bis 568 + 15 m
Objekt-Nr. KB	14/094/1
Projekt-Nr.	3TK.01131
Solothurn,	28. Januar 2022

1. Bemerkungen zum Preisangebot

1.1. Allgemeines

Es sind Nettoangebote einzureichen. Allfällige Rabatte, Skonti sowie die Mehrwertsteuer sind im Angebot aufzuführen.

Die für die Bewertung massgebende Angebotssumme setzt sich zusammen aus der Summe der Honorarkosten für die Leistungen gemäss Dokument B, den Nebenkosten, einem allfälligen Rabatt, einem allfälligen Skonto und der Mehrwertsteuer.

1.2. Kalkulationsmodell für die Berechnung des Zeitaufwandes

Für die Kalkulation des Zeitaufwandes können drei unterschiedliche Modelle zur Anwendung gelangen. Das oder die zur Anwendung gelangenen Modelle sind nachstehend angekreuzt.

<input type="checkbox"/>	<u>Zeitaufwandsberechnung nach den Baukosten</u> Das Kalkulationsmodell basiert auf der Kalkulationshilfe zur sia 103, Ausgabe 2014 (überarbeitete 2. Auflage), Art. 7. Der Zeitaufwand für die gemäss Dokument B besonders vereinbarten Leistungen wird über den Faktor für Sonderleistungen s (Art. 7.4, Kalkulationshilfe zur sia 103, Ausgabe 2014 (überarbeitete 2. Auflage), siehe Bemerkung weiter unten) berechnet. Der Teamfaktor i (Art. 7.3, Kalkulationshilfe zur sia 103, Ausgabe 2014 (überarbeitete 2. Auflage), siehe Bemerkung weiter unten) kann durch den Anbieter in seitens Bauherrn definierten Grenzen festgelegt werden.
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Angabe Zeitaufwand durch den Anbieter</u> Der Zeitaufwand für die Leistungserbringung einer Teilphase ist vom Anbieter zu berechnen und im Tabellenblatt "Kalkulation" auszuweisen. Daneben ist auch der Zeitaufwand für die besonders vereinbarten Leistungen einzurechnen.
<input type="checkbox"/>	<u>Angabe Zeitaufwand durch den Auftraggeber</u> Der Zeitaufwand für die Leistungserbringung einer Teilphase und für die zugehörigen besonders vereinbarten Leistungen wird vom Auftraggeber vorgegeben; der Anbieter hat die Verteilung des Zeitaufwandes im Tabellenblatt "Kalkulation" auszuweisen.

Vorgaben

Im Tabellenblatt "Auftraggeber" sind die Vorgaben des Auftraggebers ersichtlich.

Stundenanteil Schlüsselpersonen

Der Stundenanteil der Schlüsselpersonen an der Gesamtstundenzahl muss mindestens 40% betragen.

1.3. Preisgestaltung und Vergütung

Bürospezifische Stundenansätze:

Kat.	A	B	C	D	E	F	G
CHF/Std.							

Z	Die Vergütung erfolgt im Zeittarif nach effektivem Aufwand und offerierten Stundenansätzen.
P	Die Vergütung erfolgt als Pauschale, wobei die aufzuwendenden Stunden gleichwohl pro Person anzugeben sind.
G	Die Vergütung erfolgt als teuerungsbereinigte Pauschale, wobei die aufzuwendenden Stunden gleichwohl pro Person anzugeben sind.

Die Vergütungsart ist im Tabellenblatt "Zusammenstellung" vom Auftraggeber pro Teilphase vorgegeben bzw. festgelegt.

Teamfaktor i (gemäss Art. 7.3, Kalkulationshilfe zur sia 103, Ausgabe 2014 (überarbeitete 2. Auflage); durch Anbieter festzulegen; wird bewertet, vgl. Zuschlagskriterien im Dokument A)



$$0.5 \leq i \leq 1.0$$

Faktor für Sonderleistungen s (gemäss Art. 7.4, Kalkulationshilfe zur sia 103, Ausgabe 2014 (überarbeitete 2. Auflage); durch den Anbieter festzulegen, um den Zeitaufwand für die besonders vereinbarten Leistungen gemäss Dokument B einzurechnen)



$$1.0 \leq s$$

1.4. Umgang mit Änderung der Baukosten

Im Falle einer Berechnung des Zeitaufwand nach den Baukosten:

Eine Anpassung des Kostendachs bzw. der Pauschale/Globale erfolgt nur, wenn sich aufgrund der Änderung der Baukosten auch zusätzliche Leistungen bzw. Minderleistungen für den Anbieter ergeben und sich die Baukosten gemäss genehmigtem Kostenvoranschlag gegenüber der ursprünglichen Baukostenschätzung des Auftraggebers (B_a , B_p) mehr als 10% geändert haben. In diesem Fall erfolgt die Anpassung auf Basis von Ziffer 1.2.

1.5. Nachträge

Nachträge infolge Zusatzleistungen und Beststellungsänderungen sind vor Inangriffnahme der Arbeiten anzumelden. Bei verspäteter Anmeldung entfällt die Honorierung. Solche Nachträge werden auf derselben Basis und mit denselben Konditionen vergütet wie die hier ausgeschriebenen Leistungen.


1.6. Umgang mit Kostendach

Die offerierten Leistungen für die Teilphasen 31-41 sowie 51-53 gelten jeweils als separates Kostendach.

1.7. Nebenkosten

Unter Nebenkosten fallen:

- Kosten für Reisezeiten und -spesen, Verpflegung etc.
- Kosten für die Erstellung entsprechender Fotokopien, Dossiers und Plots
- Dokumentationskosten:
 - als Dokumentationskosten gelten Arbeitspapiere, sowie folgende Dossiers:

4.3.31	- Vorprojekt:		Exemplare
4.3.32	- Bauprojekt:	5	Exemplare
4.3.32	- Agglodossiers:	3	Exemplare
4.3.33	- Vernehmlassungsdossier:	7	Exemplare
4.3.33	- Aufagedossier:	5	Exemplare
4.3.33	- Genehmigtes Aufagedossier :	5	Exemplare
4.3.41	- Ausschreibung/Submission:	10	Exemplare
4.3.51/52	- Ausführungsprojekt / Baustellenpläne:	4	Exemplare
4.3.52	- Agglodossiers inkl. Abrechnung:	3	Exemplare
4.3.53	- Dokumente des ausgeführten Werkes (PAW):	4	Exemplare

Diese sind mit einem Prozentsatz abzuschätzen.

1.8. Kosten für weitere Unterlagen

Weitere Dossiers und Submissionsdossiers werden nach den ortsüblichen Reprotarifen separat nach Aufwand vergütet.

1.9. Preisänderungsabrechnung

Eine allfällige Preisänderungsabrechnung erfolgt gemäss der letzten, zur Zeit des Vertragsabschlusses publizierten Empfehlung zur Honorierung der KBOB, erhältlich unter www.kbob.ch.

Die Preisänderungsabrechnung erfolgt erst ab einer mit der Gleitpreisformel berechneten Veränderung von über 2 % (Berechnung erfolgt mit dem Nominallohnindex der Wirtschaftszweige 70-74).

1.10. Rechnungsstellung, Zahlungsbedingungen

Die Rechnungsstellung erfolgt quartalsweise. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage. Ein offerierter Skonto gilt bei Bezahlung innerhalb dieser Frist.

2. Zusammenstellung des Angebotes

Gliederung der Leistungen nach sia 103, Art. 4.3		Z/P/G	Aufwand [h]	Aufwand [CHF]
4.3.31	Vorprojekt	-	0	-
4.3.32	Bauprojekt	P	0	-
4.3.33	Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt	P	0	-
4.3.41	Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag	P	0	-
4.3.51	Ausführungsprojekt	P	0	-
4.3.52	Ausführung	P	0	-
4.3.53	Inbetriebnahme, Abschluss	P	0	-

*Z=Zeittarif mit Kostendach; P=Pauschale; G=teuerungsbereinigte Pauschale

Zusammenstellung:			
Honorar Leistungen gemäss Dokument B			-
Nebenkosten (%-Satz v. Honorar)	<input type="text"/>	[%]	0.00
Zwischentotal 1			-
Rabatt	<input type="text"/>	[%]	-0.00
Zwischentotal 2			-
Skonto	<input type="text"/>	[%]	-0.00
Zwischentotal 3			-
MwSt. 7.7 %			-
Angebotssumme netto inkl. MwSt. wird auf Titelblatt übertragen			-

Ort, Datum

Firmenstempel und Unterschrift(en)

Ausschreibung Ingenieurleistungen
 Projekt: Schönenwerd, Oltnen-/Aarau-/Gösgerstrasse
 Dokument D

Phase Teilphase			Bestandteil Submission	Kalkulationsmodell				Vergütungsmodell	
				Honorarberechnung nach den Baukosten		Stunden- schätzung Anbieter	Stunden- schätzung Bauherr	Zeitaufwand mit Kosten- dach	Pauschale Vergütung*
3 Projektierung	31	Vorprojekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	32	Bauprojekt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	33	Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 Ausschreibung	41	Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 Realisierung	51	Ausführungsprojekt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	51	Zuschlag für Anteil Tragkonstruktion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	52	Bauleitung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	53	Inbetriebnahme, Abschluss	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gesamtleitung				ja					
Oberbauleitung				ja					
Anpassungsfaktor r				1.00					

* teuerungsbereinigt ☐ ja ☒ nein

Aufwand der Leistungen gemäss Dokument B

				Total [h]								Total [CHF]
Zeitaufwandsberechnung nach den Baukosten				-	-	-	-	-	-	-	0	
Angabe Zeitaufwand durch den Anbieter				-							0	
Angabe Zeitaufwand durch den Bauherrn				-	-	-	-	-	-	-	0	
SUMME				0	0	0	0	0	0	0	0	
Vergütungsart				-	P	P	P	P	P	P	-	
Schlüsselperson		Honorar- kategorie	Stunden- ansatz [CHF/h]	31	32	33	41	51	52	53		
Vorname, Name												
PL			0								0	
PL Stv.			0								0	
BL			0								0	
BL Stv.			0								0	
SB			0								0	
			0								0	
Summe [h]				0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe [CHF]				0	0	0	0	0	0	0	-	0

Weitere Mitarbeiter											
Vorname, Name											
			0								0
			0								0
			0								0
			0								0
			0								0
			0								0
			0								0
			0								0
			0								0
			0								0
			0								0
Summe [h]				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe [CHF]				0	0	0	0	0	0	0	-

Total [h]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Total [CHF]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
